
ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за изпълнение на Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград" - примерни участъци

Поз. №	Наименование	Ед.м.	Коли-чество	Времетраене в работни дни	Времетраене в календарни дни	Фактична начална дата	Фактична крайна дата	Норма изработка
	ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ			**64 days**	**90 days**	**Wed 04.07.18**	**Mon 01.10.18**	
	Подготвителен етап			**5 days**	**7 days**	**Wed 04.07.18**	**Tue 10.07.18**	
	Получаване на възлагателно писмо			1 day	1 day	Wed 04.07.18	Wed 04.07.18	
	Мобилизация на строителна механизация и работна ръка			4 days	6 days	Thu 05.07.18	Tue 10.07.18	
	Етап на изпълнение на СМР			**52 days**	**72 days**	**Wed 11.07.18**	**Thu 20.09.18**	
	ПРИМЕРЕН УЧАСТЪК - Преасфалтиране на пътна настилка на ул."Хан Аспарух" от о.т. 493 до о.т.623, L=681м			**14 days**	**20 days**	**Wed 11.07.18**	**Mon 30.07.18**	
	Възвеждане и поддържане на ВОД за ул."Хан Аспарух"	к-т	1	13 days	17 days	Wed 11.07.18	Fri 27.07.18	0,08
1	Разваляне на бетонови бордюри 15/25/50	м	200	2 days	2 days	Thu 12.07.18	Fri 13.07.18	100
2	Доставка и полагане бордюри 15/25/50 -вибропресовани	м	200	5 days	5 days	Mon 16.07.18	Fri 20.07.18	40
3	Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/	бр.	21	3 days	3 days	Wed 18.07.18	Fri 20.07.18	7
4	Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти /без стойност на решетката/	бр.	1	1 day	1 day	Fri 20.07.18	Fri 20.07.18	1
5	Фрезоване горен пласт асфалтова настилка с дебд.до 4 - 6 см / и превоз на фрезования материал/	м2	4963	4 days	4 days	Tue 17.07.18	Fri 20.07.18	1240,75
6	Превоз фрезован материал до 20км	м3	248,15	4 days	4 days	Tue 17.07.18	Fri 20.07.18	62,04
7	Машинно полагане на пътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	т	595,56	4 days	6 days	Wed 25.07.18	Mon 30.07.18	148,89
8	Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и съществуваща асф.настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,	м2	4963	4 days	4 days	Tue 24.07.18	Fri 27.07.18	1240,75
9	Изкъпване на единични дупки и деформации на настилката с горещ асфалтова смес /в т.ч. полагане на битумен разлив, уплътняване с вибрационен валяк и доставка на асфалтовата смес/	т	2,4	1 day	1 day	Mon 23.07.18	Mon 23.07.18	2,4
10	Оформяне на дупки и в т.ч. Изрязване и разкъртване на стара асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна емулсия	м2	20	1 day	1 day	Mon 23.07.18	Mon 23.07.18	20
13	Демонтаж на тротоарни плочки	м2	120	2 days	2 days	Thu 12.07.18	Fri 13.07.18	60
14	Доставка и полагане на нови тротоарни плочки на плоъс 40/40/5-вибропресовани /сиви/	м2	120	6 days	8 days	Tue 17.07.18	Tue 24.07.18	20
	ПРИМЕРЕН УЧАСТЪК - Изпълнение на нова асфалтова настилка ул."Горски пътник" от о.т. 1093 до о.т.1122, L=200м			**21 days**	**29 days**	**Tue 31.07.18**	**Tue 28.08.18**	
	Възвеждане и поддържане на ВОД за ул. "Горски пътник"	к-т	1	19 days	25 days	Tue 31.07.18	Fri 24.08.18	0,05
1	Изкоп с багер земни почви при 2-ут.у-я на транспорт	м3	750	6 days	8 days	Wed 01.08.18	Wed 08.08.18	125
2	Натоварване земни почви на транспорт с багер	м3	750	6 days	8 days	Wed 01.08.18	Wed 08.08.18	125
3	Превоз земни почви до 10км	м3	750	6 days	8 days	Wed 01.08.18	Wed 08.08.18	125
4	Доставка и полагане бордюри 15/25/50 -вибропресовани	м	580	12 days	16 days	Tue 07.08.18	Wed 22.08.18	48,33
5	Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/	бр.	5	2 days	2 days	Tue 21.08.18	Wed 22.08.18	2,5
6	Направа и монтаж на метална отводнителна решетка -ДШ /в т.ч. бетоново корито с размери Дъл.=1м, Вис.=0,5м и Шир.=0,5м	м	12	4 days	6 days	Fri 17.08.18	Wed 22.08.18	3
7	Доставка и полагане на тротоаново настилка, включително всички свързани с това разходи	м3	704	14 days	18 days	Mon 06.08.18	Thu 23.08.18	50,29

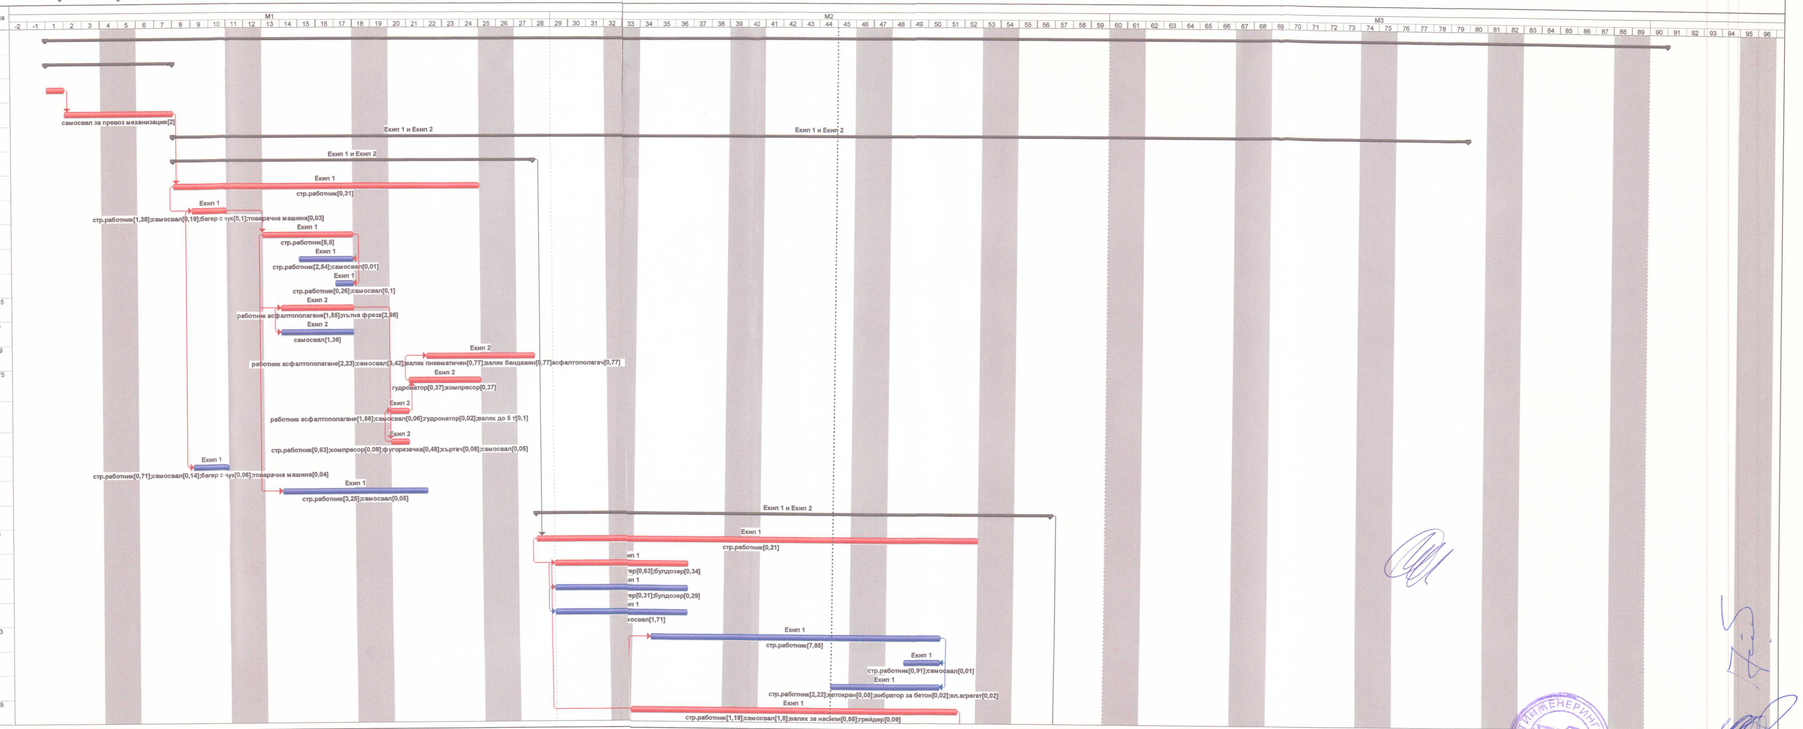

Забележка: Като основа за формиране на цените на СМР са използвани УСН, ТНС и Building Manager, от които дружеството ни е изготвило собствени, фирмени цени.

УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Н. Бекиров/

125
