
ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за изпълнение на Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград" - примерни участъци

Поз. №	Наименование	Ед.м.	Коли-чество	Времетраене в работни дни	Времетраене в календарни дни	Фактична начална дата	Фактична крайна дата	Норма изработка
8	Машинно полагане на пътна асфалтова смес-БСМ, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз на асфалтова смес/	т	211,2	2 days	2 days	Mon 27.08.18	Tue 28.08.18	105,6
9	Полагане битумен разлив, върху трошенкаменна настилка и бандаж, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,	м2	1760	2 days	4 days	Fri 24.08.18	Mon 27.08.18	880
	ПРИМЕРЕН УЧАСТЪК - Полагане на стоманобетонова настилка на ул. "Пейо Яворов" от о.т. 410 до о.т.414, L=108м			**17 days**	**23 days**	**Wed 29.08.18**	**Thu 20.09.18**	
	Въвеждане и подаръчване на ВОД за ул."Пейо Яворов"	ж-т	1	17 days	23 days	Wed 29.08.18	Thu 20.09.18	0,06
1	Изкоп с багер земни почви при 2-ут. уч-я на транспорт	м3	332	3 days	5 days	Thu 30.08.18	Mon 03.09.18	110,67
2	Натоварване земни почви на транспорт с багер	м3	332	3 days	5 days	Thu 30.08.18	Mon 03.09.18	110,67
3	Превоз земни почви до 10км	м3	332	3 days	5 days	Thu 30.08.18	Mon 03.09.18	110,67
4	Направа и разваляне на кофраж всички видове стоманобетонни плочи и греди	м2	72	8 days	10 days	Tue 11.09.18	Thu 20.09.18	9
5	Изработка и монтаж армировка - АIII-В420-БДС4758-2008-N-8мм-12см, оребрена с кръгло напречно сечение	кг	6285,04	5 days	7 days	Wed 12.09.18	Tue 18.09.18	1257,01
6	Полагане бетон С30/37- по БДС-EN-206-1:2000 и EN206-1/NA	м3	100,4	5 days	7 days	Thu 13.09.18	Wed 19.09.18	20,08
7	Доставка и полагане бордюри 15/25/50 -вибропресовани	м	250	6 days	8 days	Mon 03.09.18	Mon 10.09.18	41,67
8	Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/	бр.	1	1 day	1 day	Mon 10.09.18	Mon 10.09.18	1
9	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи /вертикане и валиране	м3	220,88	8 days	12 days	Fri 31.08.18	Tue 11.09.18	27,61
10	Превоз на бетон до 5км	м3	100,4	5 days	7 days	Thu 13.09.18	Wed 19.09.18	20,08
	Етап на предаване на обекта			**7 days**	**11 days**	**Fri 21.09.18**	**Mon 01.10.18**	
	Демобилизация на строителна механизация и работна ръка			2 days	4 days	Fri 21.09.18	Mon 24.09.18	
	Приемане на обекта без забележки			5 days	7 days	Tue 25.09.18	Mon 01.10.18	

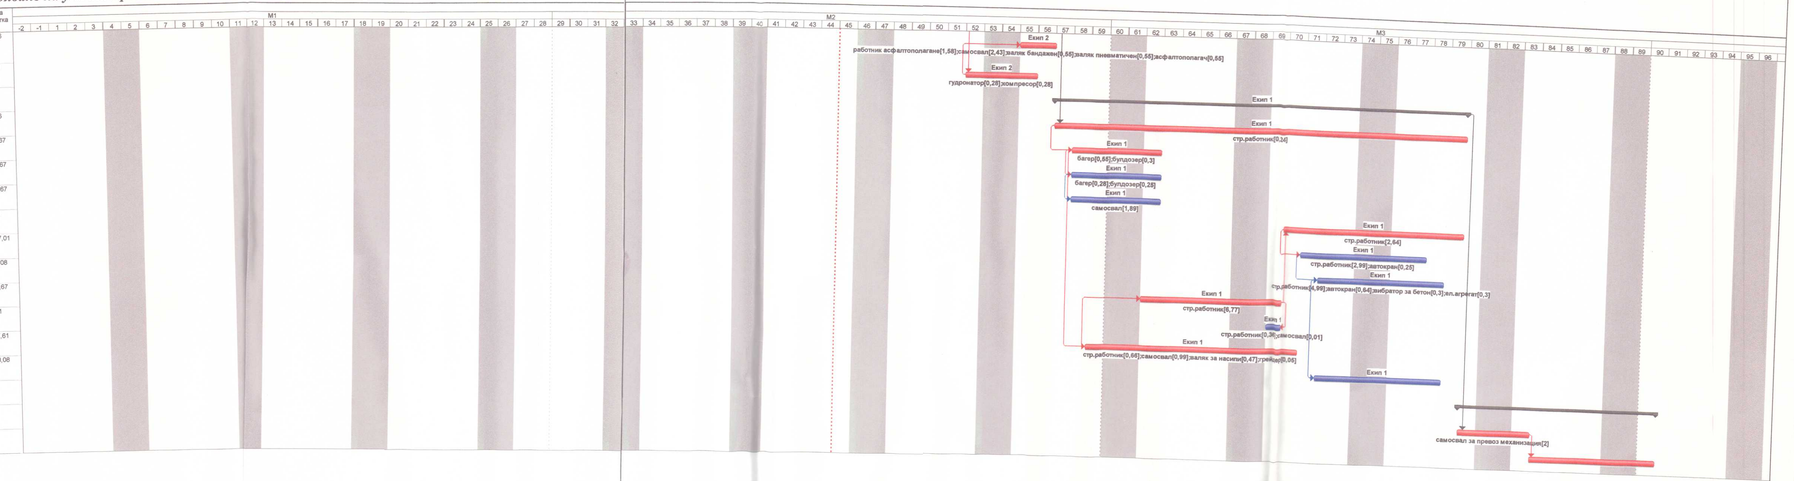

Забележка: Като основа за формиране на цените на СМР са използвани УСН, ТНС и Building Manager, от които дружеството ни е изготвило собствени, фирмени цени.

УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Н. Бекиров/
