
ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Виктор Юго"

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
32		НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	1 day	Fri 16/03/18	Fri 16/03/18	работник общ[4]
33		ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	6 days	Sun 11/03/18	Fri 16/03/18	самосвал[2]
34		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	6 days	Sun 11/03/18	Fri 16/03/18	булдозер
35		НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	6 days	Sun 11/03/18	Fri 16/03/18	работник общ[2]
36		ДОСТАВКА НА ПЯСЪК /10 см. Под тръби/	2 days	Sat 17/03/18	Sun 18/03/18	самосвал[2]
37		НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ / 10 см.под тръби/	2 days	Sat 17/03/18	Sun 18/03/18	работник общ[2],багер комбиниран
38		**Участък 1 - В1 - В6 - стр.дейности по СВО - етап 1**	**8 days**	**Sun 11/03/18**	**Sun 18/03/18**	
39		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	3 days	Sun 11/03/18	Tue 13/03/18	*багер комбиниран /вкл. в СМР по трасе
40		ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	3 days	Mon 12/03/18	Wed 14/03/18	изкопчия[2]
41		НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	2 days	Wed 14/03/18	Thu 15/03/18	*багер комбиниран /вкл. в СМР по трасе
42		ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	5 days	Sun 11/03/18	Thu 15/03/18	*самосвал /вкл. в СМР по трасе[2]
43		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	5 days	Sun 11/03/18	Thu 15/03/18	*булдозер /вкл. в СМР по трасе
44		ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	2 days	Sat 17/03/18	Sun 18/03/18	*самосвал /вкл. в СМР по трасе
45		НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	2 days	Sat 17/03/18	Sun 18/03/18	*багер комбиниран:работник общ /вкл. в СМР по трасе
46		**Участък 1 - В1 - В6 -монтажни дейности по трасе на водопровод**	**5 days**	**Mon 19/03/18**	**Fri 23/03/18**	
47		ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	5 days	Mon 19/03/18	Fri 23/03/18	ВиК монтажник[2]
48		ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PEHD DN160	2 days	Mon 19/03/18	Tue 20/03/18	ВиК монтажник[2]
49		НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1МРА	5 days	Mon 19/03/18	Fri 23/03/18	ВиК монтажник[2],апарат за челно заваряване
50		НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	1 day	Mon 19/03/18	Mon 19/03/18	ВиК монтажник[2],апарат за челно заваряване
51		НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф160	1 day	Mon 19/03/18	Mon 19/03/18	ВиК монтажник[2],апарат за челно заваряване
52		МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 150/159	1 day	Mon 19/03/18	Mon 19/03/18	ВиК монтажник
53		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	4 days	Tue 20/03/18	Fri 23/03/18	ВиК монтажник[2]
54		НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА	4 days	Tue 20/03/18	Fri 23/03/18	ВиК монтажник
55		НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150	1 day	Mon 19/03/18	Mon 19/03/18	ВиК монтажник
56		УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	5 days	Mon 19/03/18	Fri 23/03/18	ВиК монтажник
57		НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	5 days	Mon 19/03/18	Fri 23/03/18	ВиК монтажник
58		НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	5 days	Mon 19/03/18	Fri 23/03/18	ВиК монтажник
59		**Участък 1 - В1 - В6 -монтажни дейности по СВО**	**5 days**	**Mon 19/03/18**	**Fri 23/03/18**	
60		ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	5 days	Mon 19/03/18	Fri 23/03/18	*ВиК монтажник /вкл. в СМР по трасе[2]
61		Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	5 days	Mon 19/03/18	Fri 23/03/18	ВиК монтажник
62		Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	5 days	Mon 19/03/18	Fri 23/03/18	ВиК монтажник

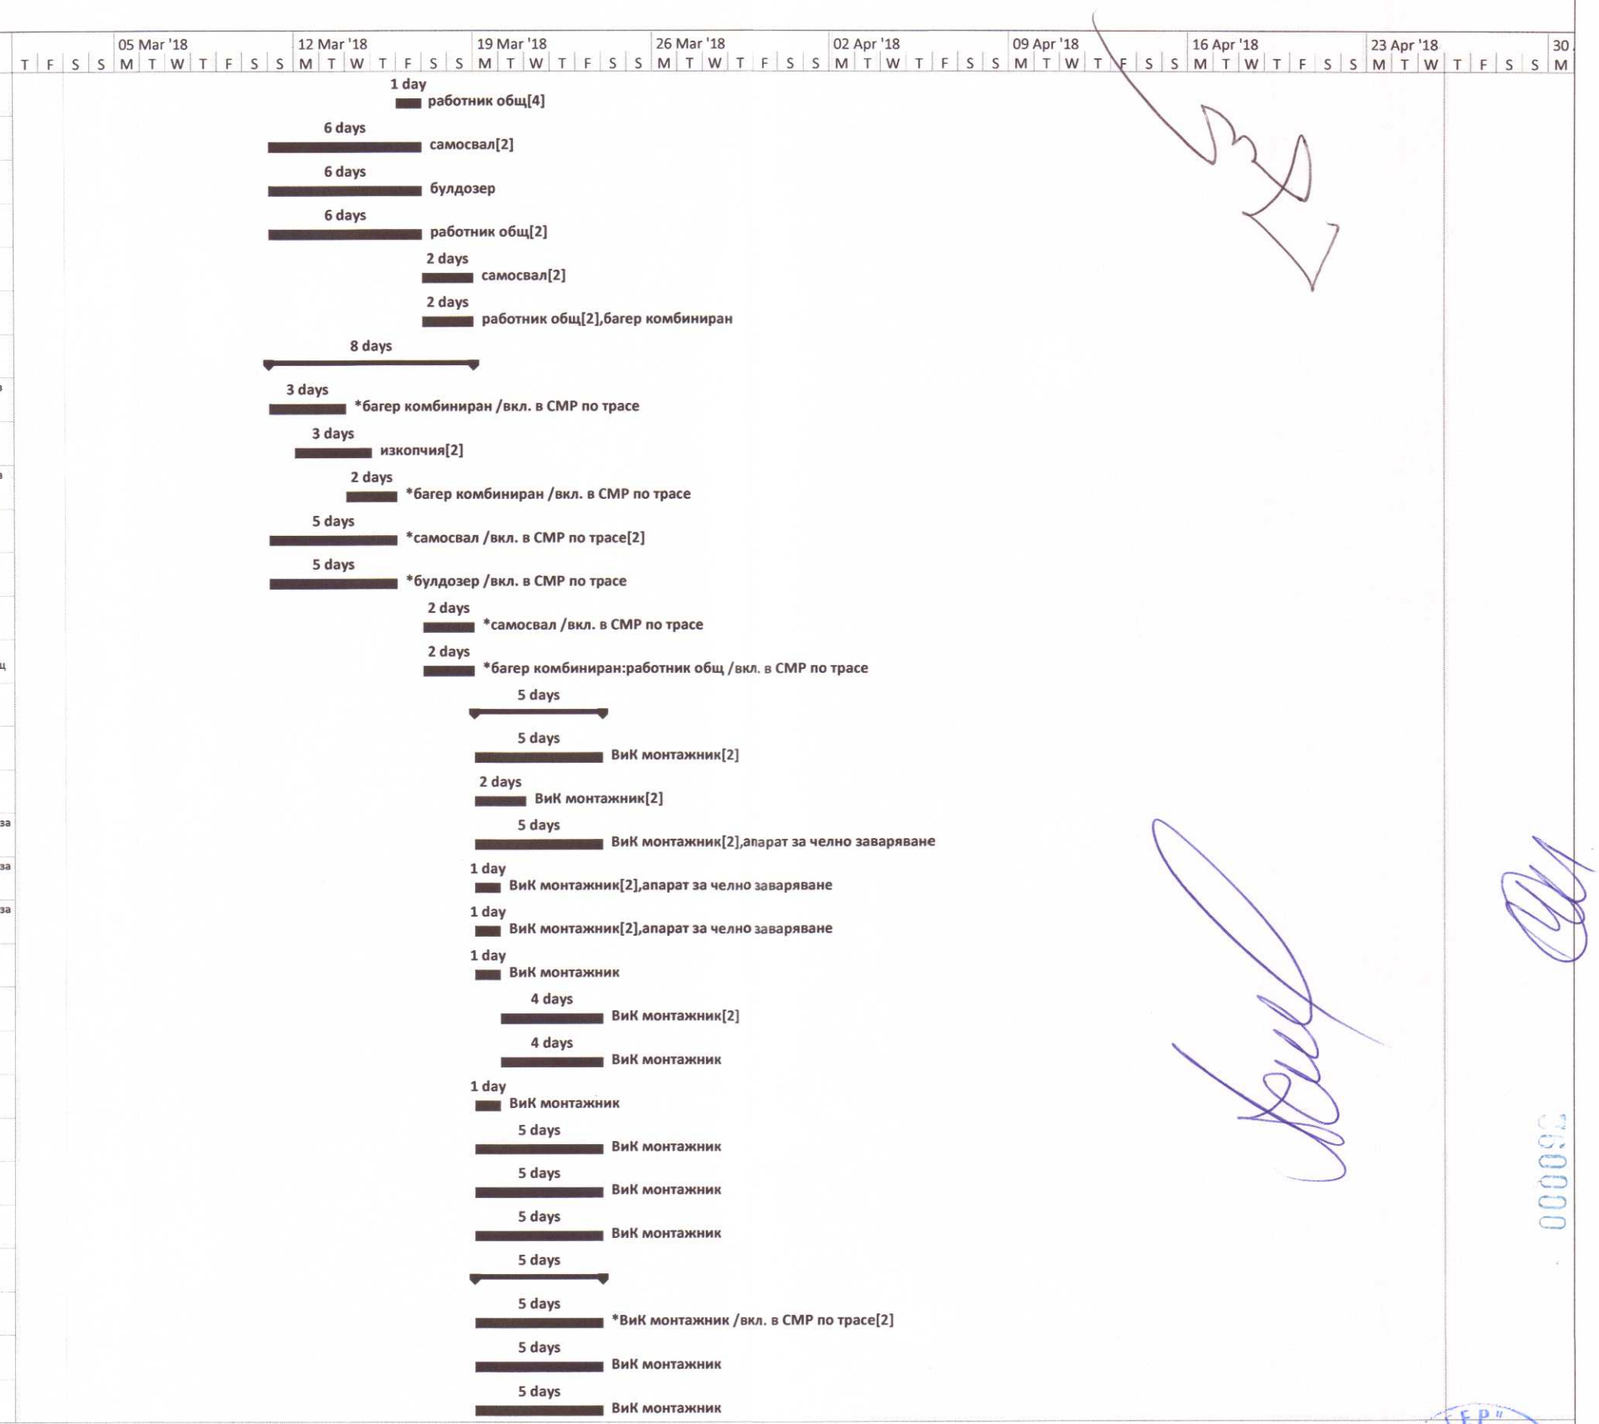

Project: grafik_vik_UGO												
	Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Manual Progress
	Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline	
	Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress	

Управител.....
