
ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов"

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
99		ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	1 day?	Tue 27.3.18	Tue 27.3.18	работник общ
100		ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ	1 day?	Tue 27.3.18	Tue 27.3.18	работник общ
101		**Участък 1 - В1 - В10 - стр.дейности по СВО - етап 2**	**3 days?**	**Sat 24.3.18**	**Mon 26.3.18**	
102		ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	*самосвал /вкл. в СМР по трасе
103		МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	*багер комбиниран и 2 работник общ /вкл. в СМР по трасе
104		УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	*работник общ,мех.трамбовка/вкл. в СМР по трасе
105		ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	работник общ
106		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	булдозер
107		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНОВ БОРДЮР	1 day?	Mon 26.3.18	Mon 26.3.18	р-к настилки
108		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	1 day?	Mon 26.3.18	Mon 26.3.18	р-к настилки[2]
109		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	1 day?	Sun 25.3.18	Sun 25.3.18	* 3 бр.р-к настилки,багер комбиниран/вкл.в СМР по трасе
110		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ	1 day?	Sun 25.3.18	Sun 25.3.18	*същите като горната позиция
111		**Участък 3 - В19 - В25 - стр.дейности по трасе на водопровод - етап 1**	**12 days?**	**Wed 7.3.18**	**Sun 18.3.18**	
112		Рязане на асфалтова настилка - Механизирано двустранно	2 days	Wed 7.3.18	Thu 8.3.18	фугорезачка;работник общ
113		РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	2 days	Thu 8.3.18	Fri 9.3.18	багер с хидрочук
114		НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКАТА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	1 day?	Sat 10.3.18	Sat 10.3.18	багер комбиниран
115		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ ИЗВЪН НАС.МЕСТО	1 day?	Sat 10.3.18	Sat 10.3.18	самосвал[2]
116		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СТР.ОТПАДЪЦИ С ПРОБЕГ 41-100М ПРИ НОРМ.УСЛ	1 day?	Sat 10.3.18	Sat 10.3.18	булдозер
117		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	3 days	Sun 11.3.18	Tue 13.3.18	багер комбиниран
118		ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	3 days	Mon 12.3.18	Wed 14.3.18	изкопчия[4]
119		ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	2 days	Wed 14.3.18	Thu 15.3.18	къртач пневматичен;компресор;работник общ[2]
120		НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	2 days	Wed 14.3.18	Thu 15.3.18	багер комбиниран
121		НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	1 day?	Fri 16.3.18	Fri 16.3.18	работник общ[4]
122		ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	6 days	Sun 11.3.18	Fri 16.3.18	самосвал[2]
123		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	6 days?	Sun 11.3.18	Fri 16.3.18	булдозер
124		НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	6 days?	Sun 11.3.18	Fri 16.3.18	работник общ[2]
125		ДОСТАВКА НА ПЯСЪК /10 см. Под тръби/	2 days	Sat 17.3.18	Sun 18.3.18	самосвал[2]
126		НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ / 10 см.под тръби/	2 days	Sat 17.3.18	Sun 18.3.18	работник общ[2];багер комбиниран
127		**Участък 3 - В19 - В25 - стр.дейности по СВО - етап 1**	**12 days?**	**Wed 7.3.18**	**Sun 18.3.18**	
128		РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	2 days	Thu 8.3.18	Fri 9.3.18	*багер с хидрочук /вкл. в СМР по трасе
129		РАЗВАЛЯНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	2 days	Thu 8.3.18	Fri 9.3.18	*багер с хидрочук /вкл. в СМР по трасе
130		РАЗВАЛЯМЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ	2 days	Wed 7.3.18	Thu 8.3.18	работник общ[2]
131		ДЕМОНТАЖ БЕТОНОВ БОРДЮР	2 days	Wed 7.3.18	Thu 8.3.18	работник общ

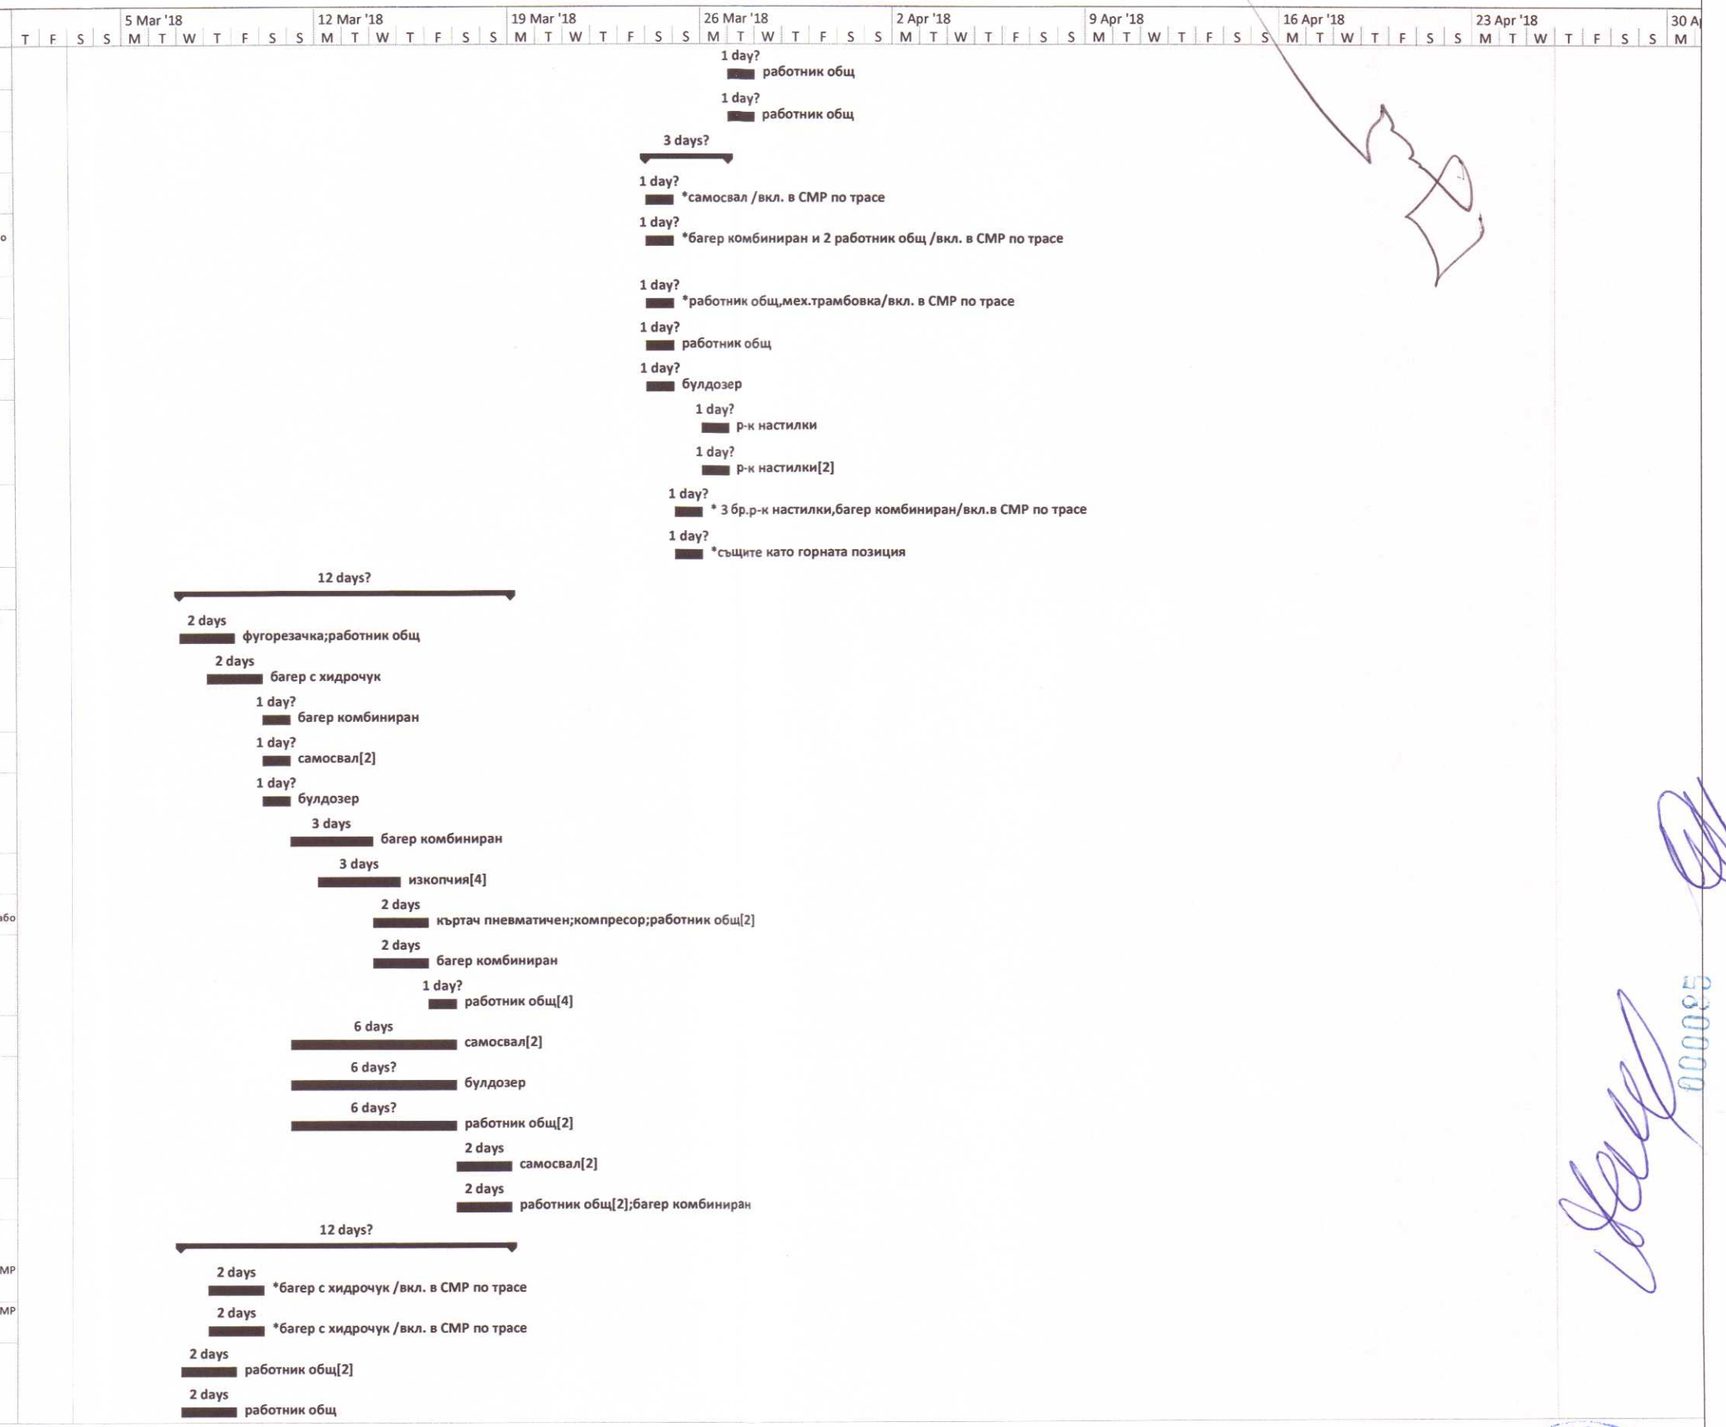

Project: NOV grafik_vik_stambolo
Date: Fri 19.1.18

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | Deadline | Progress | Manual Progress

Управител:.....
