
# ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов"

| ID | Task Mode | Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Names |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | | РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ | 2 days | Thu 8.3.18 | Fri 9.3.18 | *багер с хидрочук /вкл. в СМР по трасе;работник общ |
| 133 | | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> | 3 days | Sun 11.3.18 | Tue 13.3.18 | *багер комбиниран /вкл. в СМР по трасе |
| 134 | | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>> | 3 days? | Mon 12.3.18 | Wed 14.3.18 | изкопчия[2] |
| 135 | | НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>> | 2 days? | Wed 14.3.18 | Thu 15.3.18 | *багер комбиниран /вкл. в СМР по трасе |
| 136 | | ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО | 5 days? | Sun 11.3.18 | Thu 15.3.18 | *самосвал /вкл. в СМР по трасе[2] |
| 137 | | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>> | 5 days? | Sun 11.3.18 | Thu 15.3.18 | *булдозер /вкл. в СМР по трасе |
| 138 | | ДОСТАВКА НА ПЯСЪК | 2 days | Sat 17.3.18 | Sun 18.3.18 | *самосвал /вкл. в СМР по трасе |
| 139 | | НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ | 2 days? | Sat 17.3.18 | Sun 18.3.18 | *багер комбиниран:работник общ /вкл. в СМР по трасе |
| 140 | | **Участък 3 - B19 - B25 -монтажни дейности по трасе на водопровод** | **4 days?** | **Mon 19.3.18** | **Thu 22.3.18** | |
| 141 | | ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф125 В ИЗКОП | 4 days | Mon 19.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник[2] |
| 142 | | ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 | 3 days | Tue 20.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник[2] |
| 143 | | НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA | 3 days | Tue 20.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник[2];апарат за челно заваряване |
| 144 | | НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA | 4 days? | Mon 19.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник[2];апарат за челно заваряване |
| 145 | | НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф160 | 1 day? | Mon 19.3.18 | Mon 19.3.18 | ВиК монтажник[2];апарат за челно заваряване |
| 146 | | Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm | 1 day | Thu 22.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник |
| 147 | | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80 | 2 days | Wed 21.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник[2] |
| 148 | | НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA | 2 days? | Wed 21.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник |
| 149 | | НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ | 4 days | Mon 19.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник |
| 150 | | МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 150/159 | 1 day? | Mon 19.3.18 | Mon 19.3.18 | ВиК монтажник |
| 151 | | НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150 | 1 day? | Mon 19.3.18 | Mon 19.3.18 | ВиК монтажник |
| 152 | | УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК | 4 days | Mon 19.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник |
| 153 | | НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК | 3 days | Tue 20.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник |
| 154 | | НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD | 4 days? | Mon 19.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник |
| 155 | | **Участък 3 - B19 - B25 -монтажни дейности по СВО** | **4 days?** | **Mon 19.3.18** | **Thu 22.3.18** | |
| 156 | | ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП | 4 days? | Mon 19.3.18 | Thu 22.3.18 | *ВиК монтажник /вкл. в СМР по трасе[2] |
| 157 | | Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 125-1" | 4 days? | Mon 19.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник |
| 158 | | Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ) | 4 days? | Mon 19.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник |
| 159 | | Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ) | 4 days? | Mon 19.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник |
| 160 | | ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1" | 4 days? | Mon 19.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник |
| 161 | | Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1" | 4 days? | Mon 19.3.18 | Thu 22.3.18 | ВиК монтажник |
| 162 | | **Участък 3 - B19 - B25 - стр.дейности по трасе на водопровод - етап 2** | **5 days?** | **Fri 23.3.18** | **Tue 27.3.18** | |
| 163 | | Полагане на метална нишка,залепена на теме тръба | 1 day? | Fri 23.3.18 | Fri 23.3.18 | работник общ |
| 164 | | ДОСТАВКА НА ПЯСЪК | 1 day? | Fri 23.3.18 | Fri 23.3.18 | самосвал[2] |
| 165 | | НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /30 см.над теме тръба/ | 1 day? | Fri 23.3.18 | Fri 23.3.18 | работник общ[2];багер комбиниран;ръчна трамбовка |

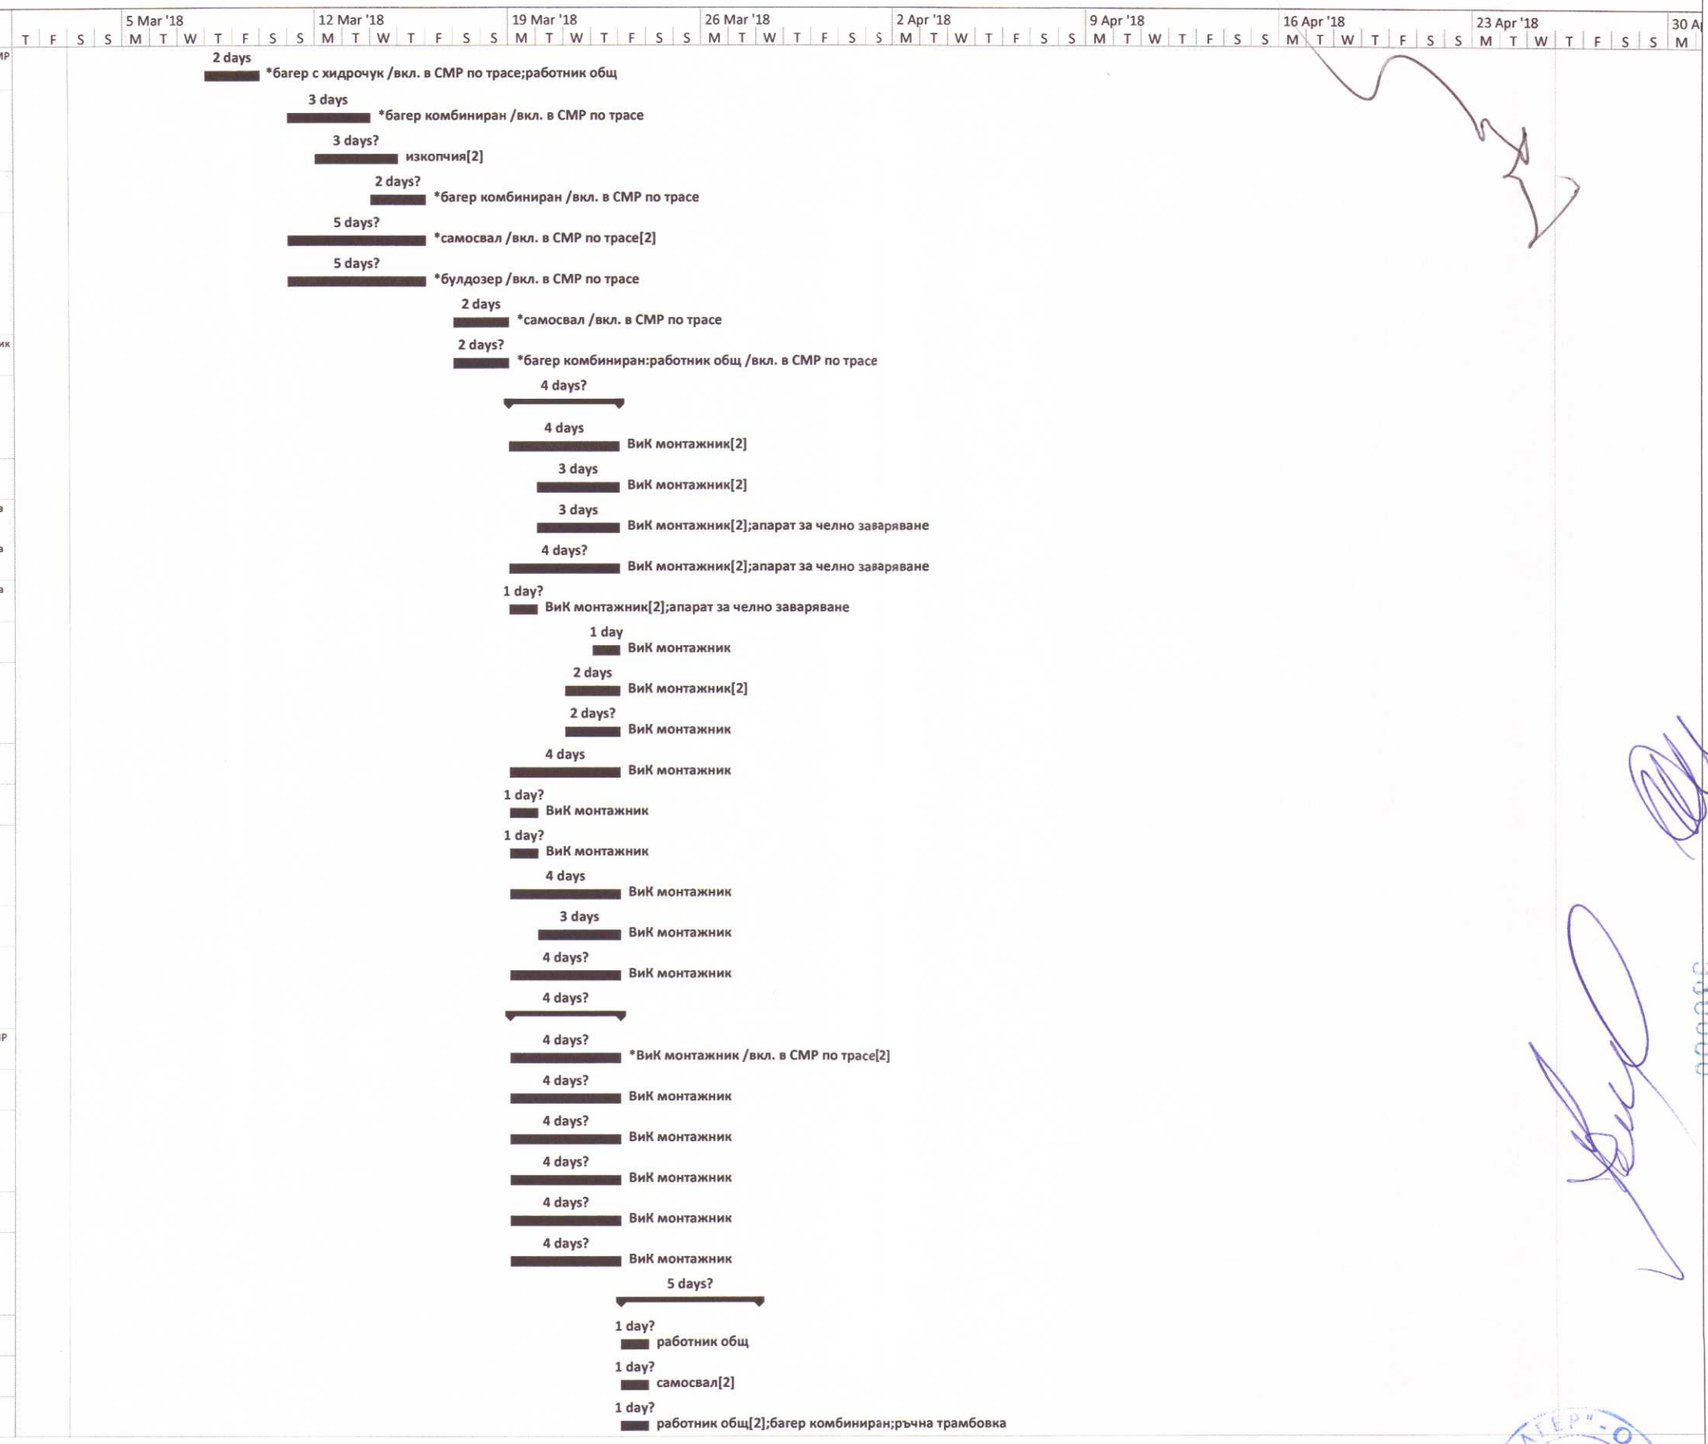


Project: NOV grafik_vik_stambolo
Date: Fri 19.1.18

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Task | Summary | External Milestone | Inactive Summary | Manual Summary Rollup | Finish-only | Manual Progress |
| Split | Project Summary | Inactive Task | Manual Task | Manual Summary | Deadline | |
| Milestone | External Tasks | Inactive Milestone | Duration-only | Start-only | Progress | |



Управител.....
