
ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов"

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
166		НЕПЛЪТНО РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	1 day?	Fri 23.3.18	Fri 23.3.18	работник общ
167		ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИЛР НАЛЯГАНЕ ДО Ф100/108	1 day?	Fri 23.3.18	Fri 23.3.18	ВиК монтажник;работник общ;компресор
168		ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИЛР НАЛЯГАНЕ ДО Ф404/426	1 day?	Fri 23.3.18	Fri 23.3.18	*същите като горната позиция
169		ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	самосвал[2]
170		МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	багер комбиниран;работник общ[2]
171		УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	работник общ;механична трамбовка
172		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА /50 см.над теме тръба	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	работник общ
173		ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК	1 day?	Sun 25.3.18	Sun 25.3.18	самосвал[2]
174		ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	1 day?	Sun 25.3.18	Sun 25.3.18	багер комбиниран;р-к настилки[3]
175		ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	1 day?	Mon 26.3.18	Mon 26.3.18	самосвал[2]
176		АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	1 day?	Mon 26.3.18	Mon 26.3.18	асфалтоплагаща машина;Валяк;р-к настилки[3]
177		ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	1 day?	Tue 27.3.18	Tue 27.3.18	работник общ
178		ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ	1 day?	Tue 27.3.18	Tue 27.3.18	работник общ
179		**Участък 3 - В19 - В25 - стр.дейности по СВО - етап 2**	**3 days?**	**Sat 24.3.18**	**Mon 26.3.18**	
180		ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	*самосвал /вкл. в СМР по трасе
181		МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	*багер комбиниран и 2 работник общ /вкл. в СМР по трасе
182		УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	*работник общ,мех.трамбовка/вкл. в СМР по трасе
183		ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	работник общ
184		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	булдозер
185		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНОВ БОРДЮР	1 day?	Mon 26.3.18	Mon 26.3.18	р-к настилки
186		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	1 day?	Mon 26.3.18	Mon 26.3.18	р-к настилки[2]
187		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	1 day?	Sun 25.3.18	Sun 25.3.18	* 3 бр.р-к настилки,багер комбиниран/вкл.в СМР по трасе
188		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ	1 day?	Sun 25.3.18	Sun 25.3.18	*същите като горната позиция
189		**Участък 2 - В10 - В19 - стр.дейности по трасе на водопровод - етап 1**	**12 days?**	**Wed 28.3.18**	**Sun 8.4.18**	
190		Рязане на асфалтова настилка - Механизирано двустранно	2 days	Wed 28.3.18	Thu 29.3.18	фугорезачка;работник общ
191		РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	2 days	Thu 29.3.18	Fri 30.3.18	багер с хидрочук
192		НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКАТА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	1 day?	Sat 31.3.18	Sat 31.3.18	багер комбиниран
193		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ ИЗВЪН НАС.МЕСТО	1 day?	Sat 31.3.18	Sat 31.3.18	самосвал[2]
194		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СТР.ОТПАДЪЦИ С ПРОБЕГ 41-100М ПРИ НОРМ.У.ВИЯ	1 day?	Sat 31.3.18	Sat 31.3.18	булдозер
195		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	3 days	Sun 1.4.18	Tue 3.4.18	багер комбиниран
196		ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	3 days	Mon 2.4.18	Wed 4.4.18	изкопчия[4]
197		ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	2 days	Wed 4.4.18	Thu 5.4.18	къртач пневматичен;компресор;работник общ[2]
198		НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	2 days	Wed 4.4.18	Thu 5.4.18	багер комбиниран
199		НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	1 day?	Fri 6.4.18	Fri 6.4.18	работник общ[4]

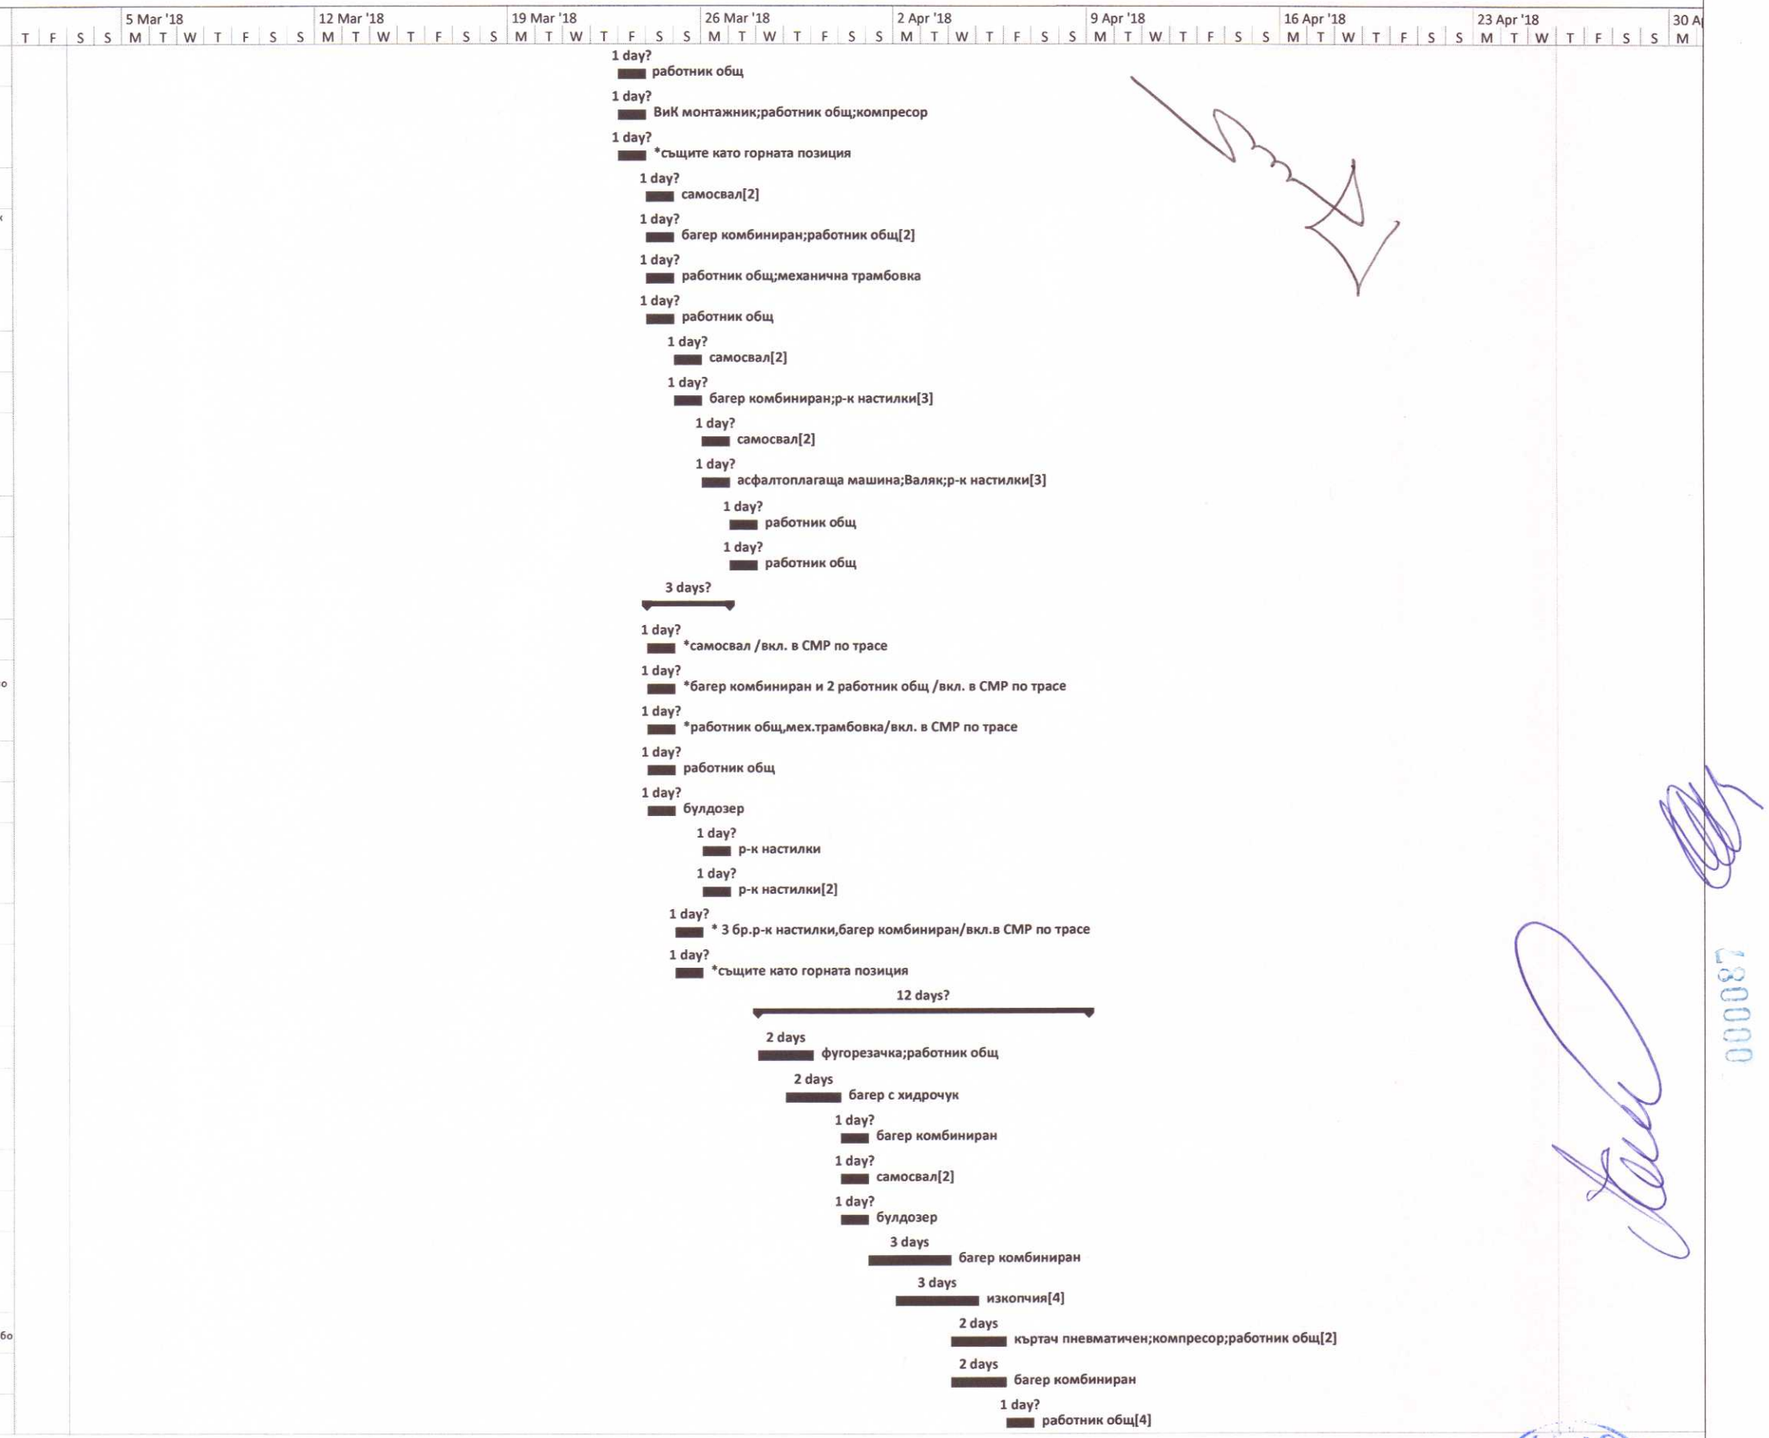

Project: NOV grafik_vik_stambolo
Date: Fri 19.1.18

Task — Split — Milestone — Summary — Project Summary — External Tasks — External Milestone — Inactive Task — Inactive Milestone — Inactive Summary — Manual Task — Duration-only — Manual Summary Rollup — Manual Summary — Start-only — Finish-only — Deadline — Progress — Manual Progress

Управител.....
