
# ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов"

| ID | Task Mode | Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Names |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО | 6 days | Sun 1.4.18 | Fri 6.4.18 | самосвал[2] |
| 201 | | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>> | 6 days? | Sun 1.4.18 | Fri 6.4.18 | булдозер |
| 202 | | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ | 6 days? | Sun 1.4.18 | Fri 6.4.18 | работник общ[2] |
| 203 | | ДОСТАВКА НА ПЯСЪК /10 см. Под тръби/ | 2 days | Sat 7.4.18 | Sun 8.4.18 | самосвал[2] |
| 204 | | НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ / 10 см.под тръби/ | 2 days | Sat 7.4.18 | Sun 8.4.18 | работник общ[2];багер комбиниран |
| 205 | | **Участък 2 - В10 - В19 - стр.дейности по СВО - етап 1** | **12 days?** | **Wed 28.3.18** | **Sun 8.4.18** | |
| 206 | | РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | 2 days | Thu 29.3.18 | Fri 30.3.18 | *багер с хидрочук /вкл. в СМР по трасе |
| 207 | | РАЗВАЛЯНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА | 2 days | Thu 29.3.18 | Fri 30.3.18 | *багер с хидрочук /вкл. в СМР по трасе |
| 208 | | РАЗВАЛЯМЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ | 2 days | Wed 28.3.18 | Thu 29.3.18 | работник общ[2] |
| 209 | | ДЕМОНТАЖ БЕТОНОВ БОРДЮР | 2 days | Wed 28.3.18 | Thu 29.3.18 | работник общ |
| 210 | | РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ | 2 days | Thu 29.3.18 | Fri 30.3.18 | *багер с хидрочук /вкл. в СМР по трасе;работник общ |
| 211 | | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>> | 3 days | Sun 1.4.18 | Tue 3.4.18 | *багер комбиниран /вкл. в СМР по трасе |
| 212 | | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>> | 3 days? | Mon 2.4.18 | Wed 4.4.18 | изкопчия[2] |
| 213 | | НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>> | 2 days? | Wed 4.4.18 | Thu 5.4.18 | *багер комбиниран /вкл. в СМР по трасе |
| 214 | | ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО | 5 days? | Sun 1.4.18 | Thu 5.4.18 | *самосвал /вкл. в СМР по трасе[2] |
| 215 | | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>> | 5 days? | Sun 1.4.18 | Thu 5.4.18 | *булдозер /вкл. в СМР по трасе |
| 216 | | ДОСТАВКА НА ПЯСЪК | 2 days | Sat 7.4.18 | Sun 8.4.18 | *самосвал /вкл. в СМР по трасе |
| 217 | | НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ | 2 days? | Sat 7.4.18 | Sun 8.4.18 | *багер комбиниран:работник общ /вкл. в СМР по трасе |
| 218 | | **Участък 2 - В10 - В19 -монтажни дейности по трасе на водопровод** | **5 days?** | **Mon 9.4.18** | **Fri 13.4.18** | |
| 219 | | ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф125 В ИЗКОП | 5 days | Mon 9.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник[2] |
| 220 | | ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 | 4 days | Tue 10.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник[2] |
| 221 | | ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф63 В ИЗКОП | 4 days | Tue 10.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник[2] |
| 222 | | НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1МРА | 4 days | Tue 10.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник[2];апарат за челно заваряване |
| 223 | | НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1МРА | 5 days | Mon 9.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник[2];апарат за челно заваряване |
| 224 | | НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф63 | 4 days | Tue 10.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник[2];апарат за челно заваряване |
| 225 | | Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО РЕ90/Е80mm | 1 day | Fri 13.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник |
| 226 | | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80 | 2 days | Thu 12.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник[2] |
| 227 | | НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА | 2 days? | Thu 12.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник |
| 228 | | НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ | 4 days | Tue 10.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник |
| 229 | | НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф60ММ | 2 days | Thu 12.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник |
| 230 | | УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК | 5 days | Mon 9.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник |
| 231 | | НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК | 2 days | Thu 12.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник |
| 232 | | НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД | 5 days | Mon 9.4.18 | Fri 13.4.18 | ВиК монтажник |
| 233 | | **Участък 2 - В10 - В19 -монтажни дейности по СВО** | **5 days** | **Mon 9.4.18** | **Fri 13.4.18** | |

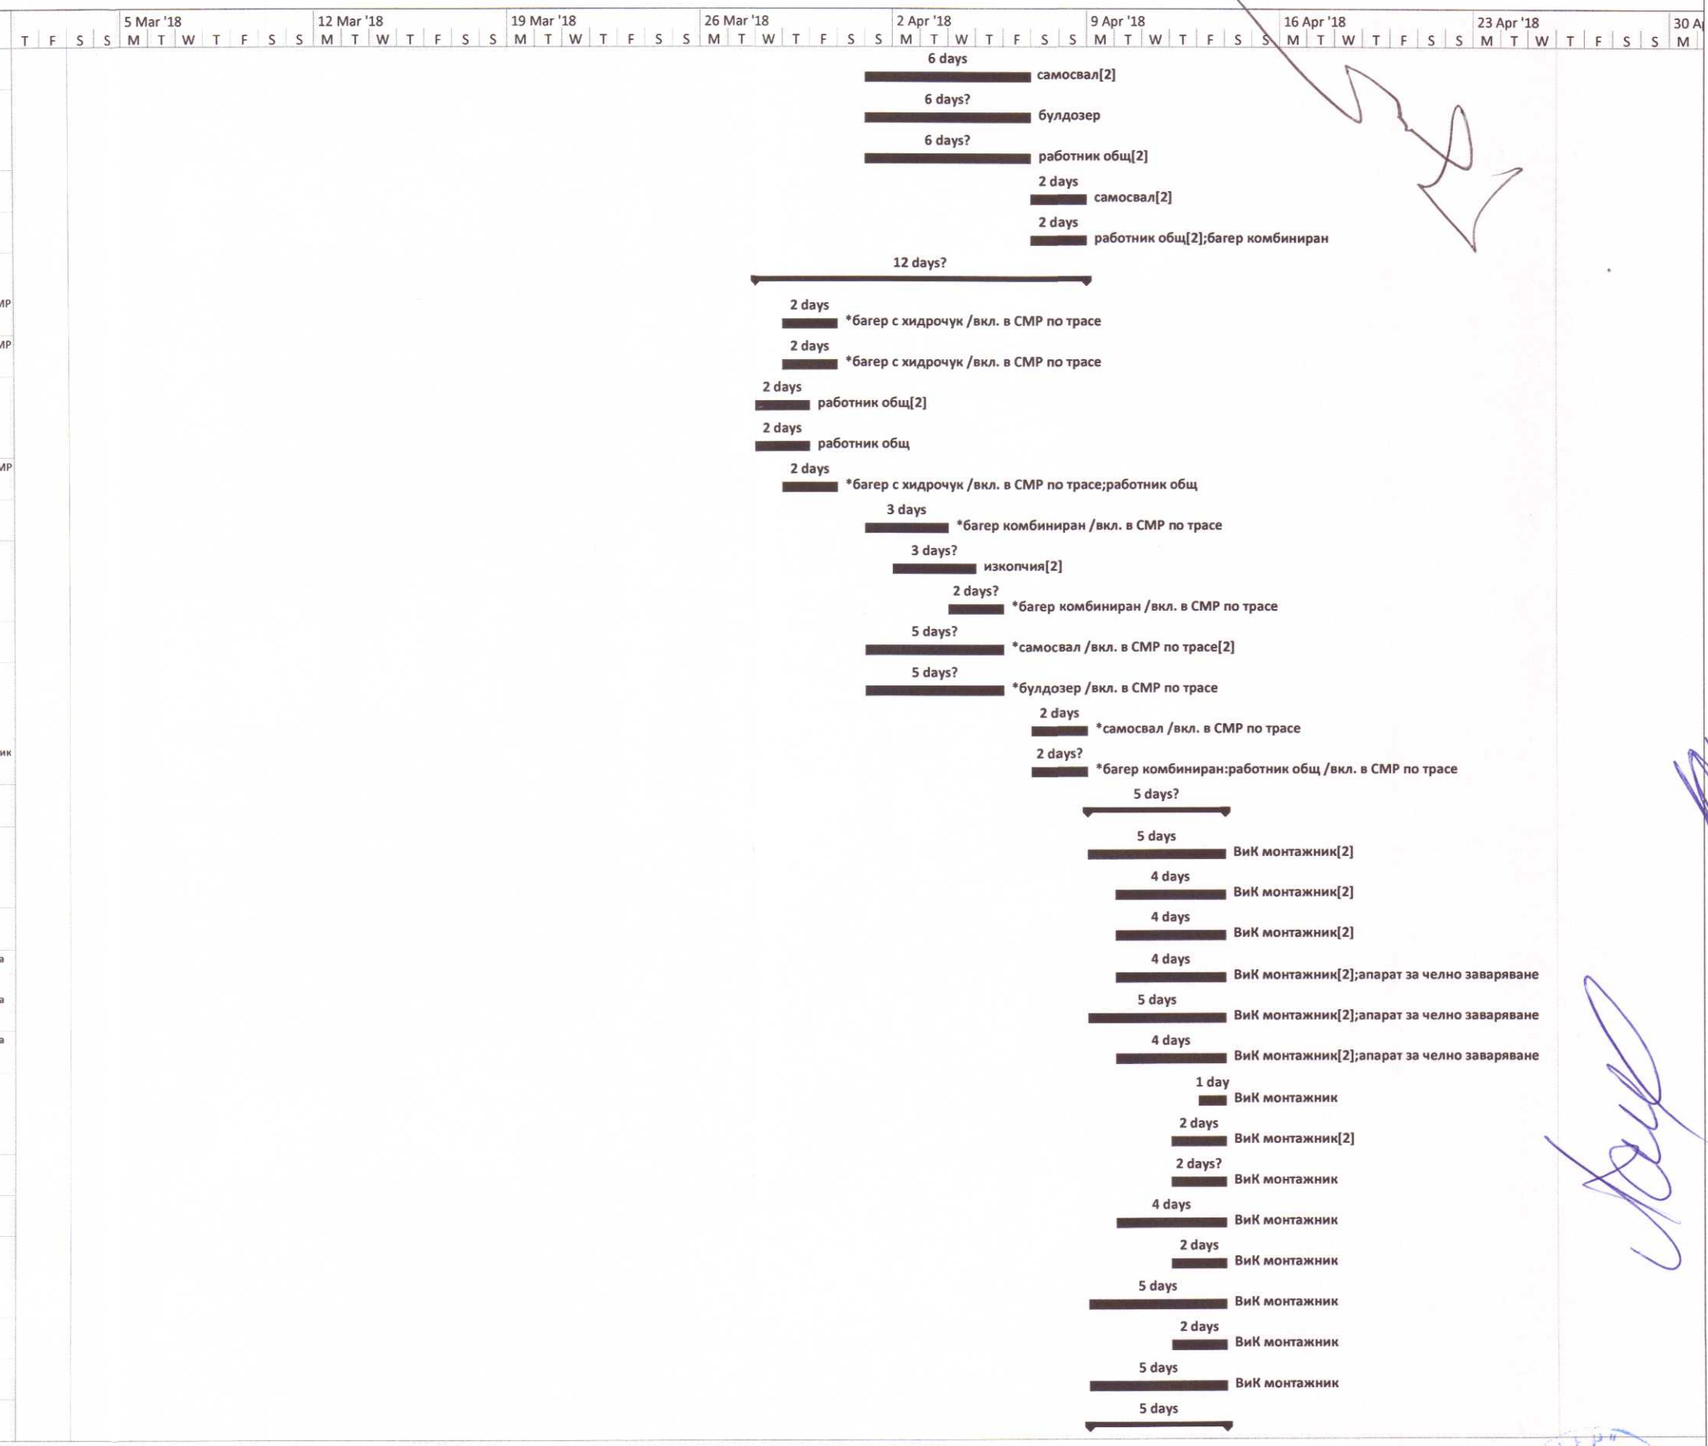


Project: NOV grafik_vik_stambolo
Date: Fri 19.1.18

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | Deadline | Progress | Manual Progress



Управител:.....
