
ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов"

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
234		ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	5 days	Mon 9.4.18	Fri 13.4.18	*ВиК монтажник /вкл. в СМР по трасе[2]
235		Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 125-1"	5 days	Mon 9.4.18	Fri 13.4.18	ВиК монтажник
236		Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 63-1"	4 days	Tue 10.4.18	Fri 13.4.18	ВиК монтажник
237		Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	5 days	Mon 9.4.18	Fri 13.4.18	ВиК монтажник
238		Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	5 days	Mon 9.4.18	Fri 13.4.18	ВиК монтажник
239		ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	5 days	Mon 9.4.18	Fri 13.4.18	ВиК монтажник
240		Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	5 days	Mon 9.4.18	Fri 13.4.18	ВиК монтажник
241		**Участък 2 - В10 - В19 - стр.дейности по трасе на водопровод - етап 2**	**5 days?**	**Sat 14.4.18**	**Wed 18.4.18**	
242		Полагане на метална нишка,залепена на теме тръба	1 day?	Sat 14.4.18	Sat 14.4.18	работник общ
243		ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	1 day?	Sat 14.4.18	Sat 14.4.18	самосвал[2]
244		НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /30 см.над тема тръба/	1 day?	Sat 14.4.18	Sat 14.4.18	работник общ[2];багер комбиниран;ръчна трамбовка
245		НЕПЛЪТНО РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	1 day?	Sat 14.4.18	Sat 14.4.18	работник общ
246		ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	1 day?	Sat 14.4.18	Sat 14.4.18	ВиК монтажник;работник общ;компресор
247		ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426	1 day?	Sat 14.4.18	Sat 14.4.18	*същите като горната позиция
248		ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	1 day?	Sun 15.4.18	Sun 15.4.18	самосвал[2]
249		МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	1 day?	Sun 15.4.18	Sun 15.4.18	багер комбиниран;работник общ[2]
250		УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	1 day?	Sun 15.4.18	Sun 15.4.18	работник общ;механична трамбовка
251		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА /50 см.над теме тръба	1 day?	Sun 15.4.18	Sun 15.4.18	работник общ
252		ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК	1 day?	Mon 16.4.18	Mon 16.4.18	самосвал[2]
253		ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	1 day?	Mon 16.4.18	Mon 16.4.18	багер комбиниран;р-к настилки[3]
254		ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	1 day?	Tue 17.4.18	Tue 17.4.18	самосвал[2]
255		АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	1 day?	Tue 17.4.18	Tue 17.4.18	асфалтоплагаща машина;Валяк;р-к настилки[3]
256		ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	1 day?	Wed 18.4.18	Wed 18.4.18	работник общ
257		ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ	1 day?	Wed 18.4.18	Wed 18.4.18	работник общ
258		**Участък 2 - В10 - В19 - стр.дейности по СВО - етап 2**	**3 days?**	**Sun 15.4.18**	**Tue 17.4.18**	
259		ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	1 day?	Sun 15.4.18	Sun 15.4.18	*самосвал /вкл. в СМР по трасе
260		МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	1 day?	Sun 15.4.18	Sun 15.4.18	*багер комбиниран и 2 работник общ /вкл. в СМР по трасе
261		УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	1 day?	Sun 15.4.18	Sun 15.4.18	*работник общ,мех.трамбовка/вкл. в СМР по трасе
262		ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	1 day?	Sun 15.4.18	Sun 15.4.18	работник общ
263		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	1 day?	Sun 15.4.18	Sun 15.4.18	булдозер
264		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНОВ БОРДЮР	1 day?	Tue 17.4.18	Tue 17.4.18	р-к настилки
265		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	1 day?	Tue 17.4.18	Tue 17.4.18	р-к настилки[2]
266		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	1 day?	Mon 16.4.18	Mon 16.4.18	* 3 бр.р-к настилки,багер комбиниран/вкл.в СМР по трасе
267		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ	1 day?	Mon 16.4.18	Mon 16.4.18	*същите като горната позиция

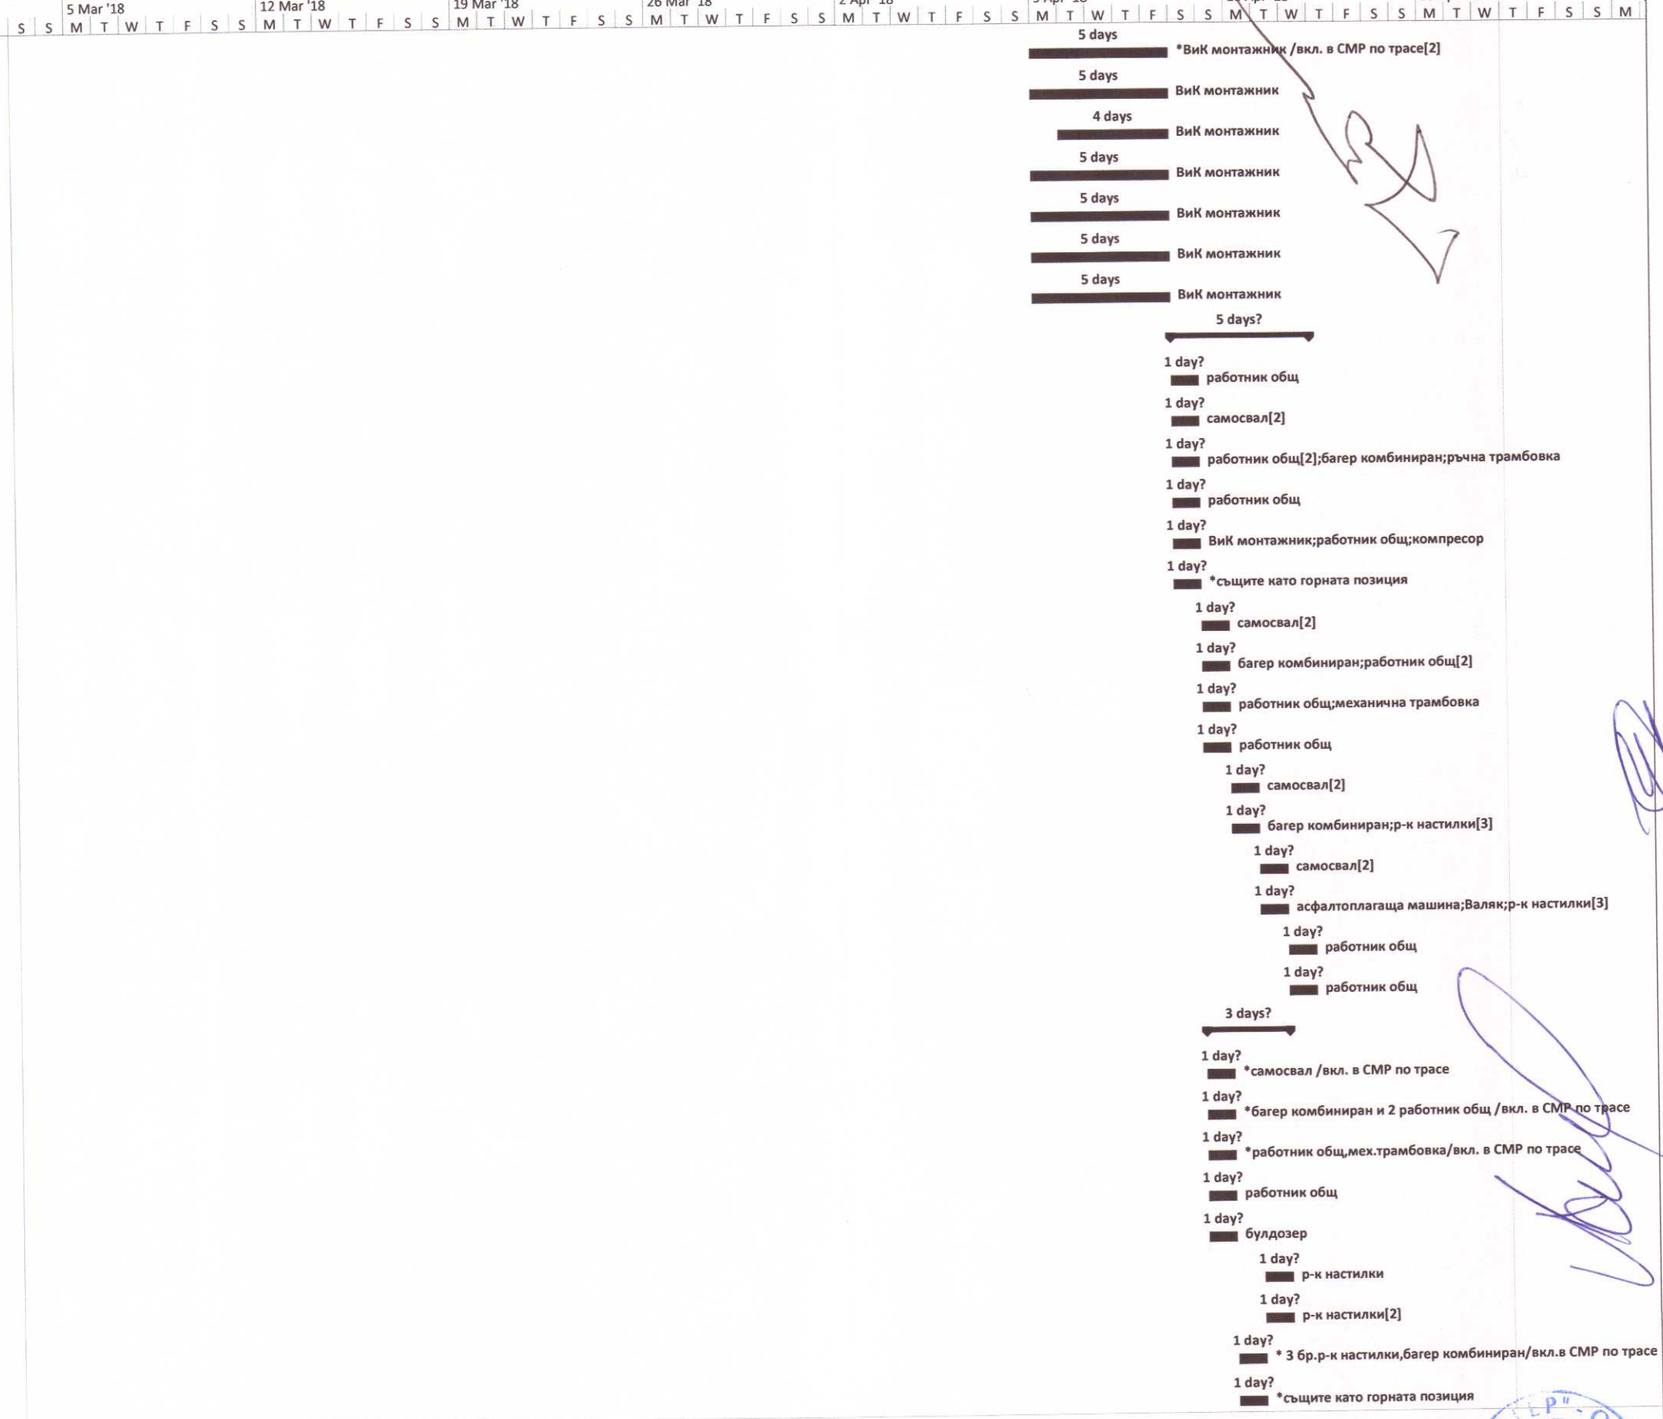

Управител:.....
