ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ГРАФИК

Име на проекта - „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ДГ „Радост" гр. Златоград и ДГ „Щастливо детство" с. Старцево, Община Златоград"

№	описания	м-а	к-во	бр. р-ци	календарни дни																										
	Обект 1 - Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ДГ „Радост" гр. Златоград				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I	ОТОПЛЕНИЕ																															
1	Котел комбиниран на пелети и дърва,комплект с горелка ,отоплителна монщост 210kW,коминни тела,табло управление - котел,помпи включително и по външна температура	бр	1	3																												
2	Затворен разширителен съд 300 литра	бр	1	2																												
3	П1 - Циркулационна помпа към котел за:10,5m³/h;40kPa	бр	1																													
4	П2 - Циркулационна помпа към БГВ за:0,5m³/h;30kPa	бр	1																													
5	П3 - Циркулационна помпа към радиатори за:8,3m³/h;70kPa	бр	1																													
6	Възвратен клапан DN20	бр	1																													
7	Възвратен клапан DN65	бр	1																													
8	Възвратен клапан DN80	бр	1																													
9	Воден филтър DN20	бр	1																													
10	Воден филтър DN65	бр	1																													
11	Воден филтър DN80	бр	1																													
12	Алуминиеви глидери - H = 500 мм	бр	1369	3																												
13	Монтаж на алуминиеви радиатори - H = 500 мм	бр	86																													
14	Сет(вент.термост + секр+ термоглава)	бр	86																													
15	Кит за радиатори	бр	86																													
16	Автоматичен обезвъздушител Ду 15,прав за щрангове	бр	24																													
17	Тръба ∅15 Steelpres или подобна	м	276																													
18	Тръба ∅18 Steelpres или подобна	м	144																													
19	Тръба ∅22 Steelpres или подобна	м	282																													
20	Тръба ∅28 Steelpres или подобна	м	78																													
21	Изолация K Flex ∅28x13	м	78																													
22	Тръба ∅35 Steelpres или подобна	м	30																													
23	Изолация K Flex ∅35x13	м	30																													
24	Тръба ∅42 Steelpres или подобна	м	12																													
25	Изолация K Flex ∅42x13	м	12																													
26	Тръба ∅54 Steelpres или подобна	м	12																													
27	Изолация K Flex ∅54x13	м	12																													
28	Тръба ∅76,1 Steelpres или подобна	м	72																													
29	Изолация K Flex ∅76x13	м	72																													
30	Преход ∅15x1/2",мъжки	бр	172																													

31	Баланс вентил DN15	бр	5																												
32	Баланс вентил DN20	бр	16																												
33	Баланс вентил DN25	бр	1																												
34	Спирателен вентил DN15,с ипрзнител	бр	5																												
35	Спирателен вентил DN20,с ипрзнител	бр	16																												
36	Спирателен вентил DN25,с ипрзнител	бр	1																												
37	Коляно Ø76,1,ж/ж 90°	бр	10																												
38	Коляно Ø22,ж/ж 90°	бр	40																												
39	Коляно Ø18,ж/ж 90°	бр	20																												
40	Коляно Ø15,ж/ж 90°	бр	40	6																											
41	Дъга Ø15,45°	бр	80																												
42	Редуктивен тройник Ø76/35	бр	8																												
43	Редуктивен тройник Ø54/22	бр	8																												
44	Редуктивен тройник Ø42/22	бр	8																												
45	Редуктивен тройник Ø35/22	бр	8																												
46	Редуктивен тройник Ø28/22	бр	8																												
47	Редуктивен тройник Ø22/15	бр	140																												
48	Редукция Ø76,1/54	бр	2																												
49	Редукция Ø54/42	бр	2																												
50	Редукция Ø42/35	бр	2																												
51	Редукция Ø35/28	бр	2																												
52	Редукция Ø28/22	бр	2																												
53	Редукция Ø22/15	бр	140																												
54	Редукция Ø18/15	бр	20																												
55	Скоба с гума 1/2"	бр	5																												
56	Скоба с гума 3/4"	бр	5																												
57	Скоба с гума 1"	бр	5																												
58	Скоба с гума 1 ½"	бр	5																												
59	Скоба с гума 2"	бр	5																												
60	Скоба с гума 2 1/2"	бр	5																												
61	Скоба с гума 3"	бр	5																												
62	П профил 28/30x2000	бр	20																												
63	Шпилки М8x1000	бр	20																												
64	Анкер М8	бр	200																												
65	Гайка М8	бр	400																				4								
66	Хидравлична и топла проба на тръбна мрежа	бр	1	4																					1	1	1	1	1		
67	Топла на отоплителни тела	бр	86	1																					1	1	1	1	1		
68	Конзоли за радиатори	бр	344																												
69	Пробиване на отвори за щрангове	бр	50																												
70	Замонолитване на отвори и възстановяване на настилка	бр	50	1																			1	1							
I	ОТОПЛЕНИЕ																														
II	ДЕМОНТАЖ																														
1	Демонтаж и изнасяне на чугунени радиатори	бр	86	3																											
2	Демонтаж и изнасяне на стоманени тръби	м	806																												
II	ДЕМОНТАЖ																														

	Обект 2 - Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ДГ „Щастливо дество" с. Старцево, Община Златоград				календарни дни																										
I	ОТОПЛЕНИЕ				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Котел комбиниран на пелети и дърва,комплект с горелка ,отоплителна монщост 150kW,коминни тела,табло управление - котел,помпи включително и по външна температура	бр	1	3							3																				
2	Затворен разширителен съд 150 литра	бр	1	2																											
3	П1 - Циркулационна помпа към котел за:7,5m³/h;50kPa	бр	1																												
4	П2 - Циркулационна помпа към БГВ за:0,45m³/h;30kPa	бр	1																												
5	П3 - Циркулационна помпа към радиатори за:6,7m³/h;60kPa	бр	1																												
6	Възвратен клапан DN20	бр	1																												
7	Възвратен клапан DN65	бр	1																												
8	Възвратен клапан DN80	бр	1																												
9	Воден филтър DN20	бр	1																												
10	Воден филтър DN65	бр	1																												
11	Воден филтър DN80	бр	1																												
12	Алуминиеви глидери - H = 500 мм	бр	1082	3																											
13	Монтаж на алуминиеви радиатори - H = 500 мм	бр	79																												
14	Сет(вент.термост + секр+ термоглава)	бр	79																												
15	Кит за радиатори	бр	79																												
16	Автоматичен обезвъздушител Ду 15,прав за щрангове	бр	38	6																											
17	Тръба ∅15 Steelpres или подобна	м	162																												
18	Тръба ∅18 Steelpres или подобна	м	60																												
19	Тръба ∅22 Steelpres или подобна	м	354																												
20	Тръба ∅28 Steelpres или подобна	м	42																												
21	Изолация К Flex ∅28x13	м	42																												
22	Тръба ∅35 Steelpres или подобна	м	40																												
23	Изолация К Flex ∅35x13	м	40																												
24	Тръба ∅42 Steelpres или подобна	м	42																												
25	Изолация К Flex ∅42x13	м	42																												
26	Тръба ∅54 Steelpres или подобна	м	18																												
27	Изолация К Flex ∅54x13	м	18																												
28	Тръба ∅76,1 Steelpres или подобна	м	84																												
29	Изолация К Flex ∅76x13	м	84																												
30	Преход ∅76,1x2 1/2",мъжки	бр	6																												
31	Преход ∅15x1/2",мъжки	бр	158																												
32	Преход ∅22x3/4",женски	бр	8																												
33	Баланс вентил DN20	бр	17																												
34	Спирателен вентил DN20,с ипрзнител	бр	17																												
35	Коляно ∅76,1,ж/ж 90°	бр	10																												
36	Коляно ∅22,ж/ж 90°	бр	50																												
37	Коляно ∅18,ж/ж 90°	бр	10																												
38	Дъга ∅15,45°	бр	100																												
39	Тройник ∅76	бр	4																												
40	Редуктивен тройник ∅76/35	бр	8																												
41	Редуктивен тройник ∅54/22	бр	8																												
42	Редуктивен тройник ∅42/22	бр	8																												

43	Редуктивен тройник ∅35/22	бр	8																													
44	Редуктивен тройник ∅28/22	бр	8																													
45	Редуктивен тройник ∅22/15	бр	140																													
46	Редукция ∅76,1/54	бр	2																													
47	Редукция ∅54/42	бр	2																													
48	Редукция ∅42/35	бр	2																													
49	Редукция ∅35/28	бр	2																													
50	Редукция ∅28/22	бр	2																													
51	Редукция ∅22/15	бр	140																													
52	Редукция ∅18/15	бр	20																													
53	Скоба с гума 3/8"	бр	5																													
54	Скоба с гума 1/2"	бр	5																													
55	Скоба с гума 3/4"	бр	5																													
56	Скоба с гума 1"	бр	5																													
57	Скоба с гума 1 ½"	бр	5																													
58	Скоба с гума 2"	бр	5																													
59	Скоба с гума 2 1/2"	бр	5																													
60	Скоба с гума 3"	бр	5																													
61	П профил 28/30x2000	бр	20																													
62	Шпилки М8x1000	бр	100																													
63	Анкер М8	бр	500																													
64	Гайка М8	бр	1000																				3									
65	Хидравлична и топла проба на тръбна мрежа	бр	1	3																					1	1	1	1	1			
66	Топла на отоплителни тела	бр	79	1																					1	1	1	1	1			
67	Конзоли за радиатори	бр	150																													
68	Пробиване на отвори за щрангове	бр	50																													
69	Замонолитване на отвори и възстановяване на настилка	бр	50	1																			1	1								
I	ОТОПЛЕНИЕ																															
II	ДЕМОНТАЖ																															
1	Демонтаж и изнасяне на чугунени радиатори	бр	79	3							3																					
2	Демонтаж и изнасяне на стоманени тръби	м	802																													

Подпис и печат: Зам. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Име на представляващия участника и длъжност

ЕООД

Диаграма на работната ръка

Средносписъчен брой работници - 17

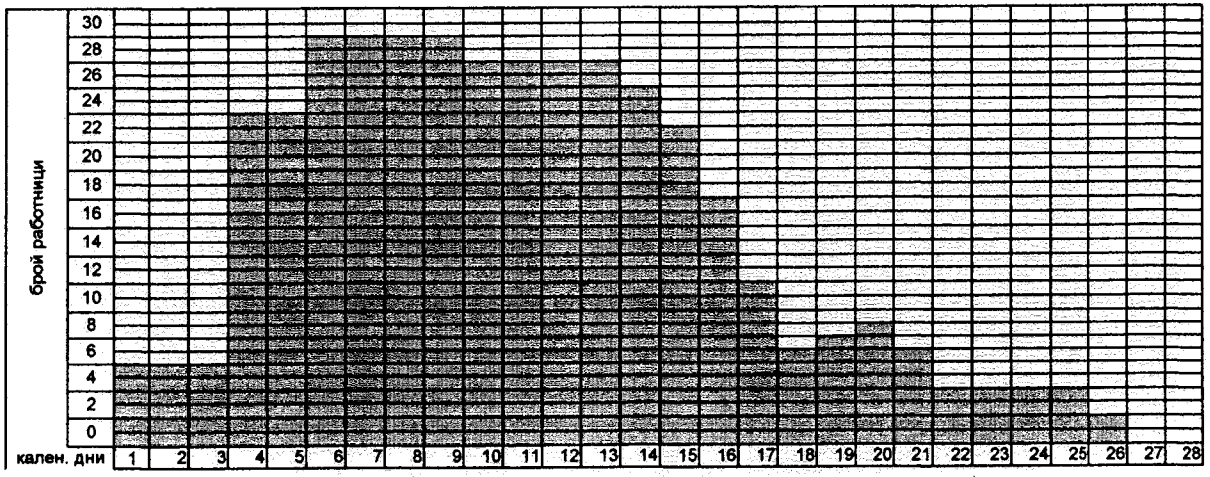

Подпис и печат:

Име на представляващия участника и длъжност

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

ЕООД „Златоград"

43
