
ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов"

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
1		**ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ОБЕКТА**	**54 days?**	**Sat 3.3.18**	**Wed 25.4.18**	
2		**Подготвителни работи,разполагане на техника и фургони, Устройване на складови площи, ВОБДП. Геодезическо отлагане на трасе**	2 days	Sat 3.3.18	Sun 4.3.18	бордови автомобил;работник общ[2];геодезист
3		**Доставка на материали**	**2 days?**	**Mon 5.3.18**	**Tue 6.3.18**	**бордови автомобил;работник общ[2]**
4		ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
5		ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1MPa	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
6		ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10А	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
7		ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП 125Х90Х125/10А	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
8		ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125/10А	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
9		Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN90/63 - 1MPa	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
10		Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN125/90 - 1MPa	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
11		Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN160/125 - 1MPa	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
12		Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
13		Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
14		ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-30ГР.	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
15		ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-45ГР.	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
16		ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-60ГР.	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
17		ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-90ГР.	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
18		ДОСТАВКА КАПА РЕНД DN63 - 1MPa	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
19		Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф63/10А	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
20		Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
21		Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125 - 1MPA	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
22		Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК РЕНД DN160 - 1MPa	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
23		ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф63 1MPA	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
24		ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
25		ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
26		СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ РЕНД DN160 - 1MPa	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
27		ДОСТАВКА СК ДУ 50 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
28		ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
29		ДОСТАВКА СК ДУ 125 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
30		ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	2 days	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
31		СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN150 - 1MPa	2 days?	Mon 5.3.18	Tue 6.3.18	
32		**Участък 1 - В1 - В10 - стр.дейности по трасе на водопровод - етап 1**	**12 days?**	**Wed 7.3.18**	**Sun 18.3.18**	
33		Рязане на асфалтова настилка - Механизирано двустранно	2 days	Wed 7.3.18	Thu 8.3.18	фугорезачка;работник общ

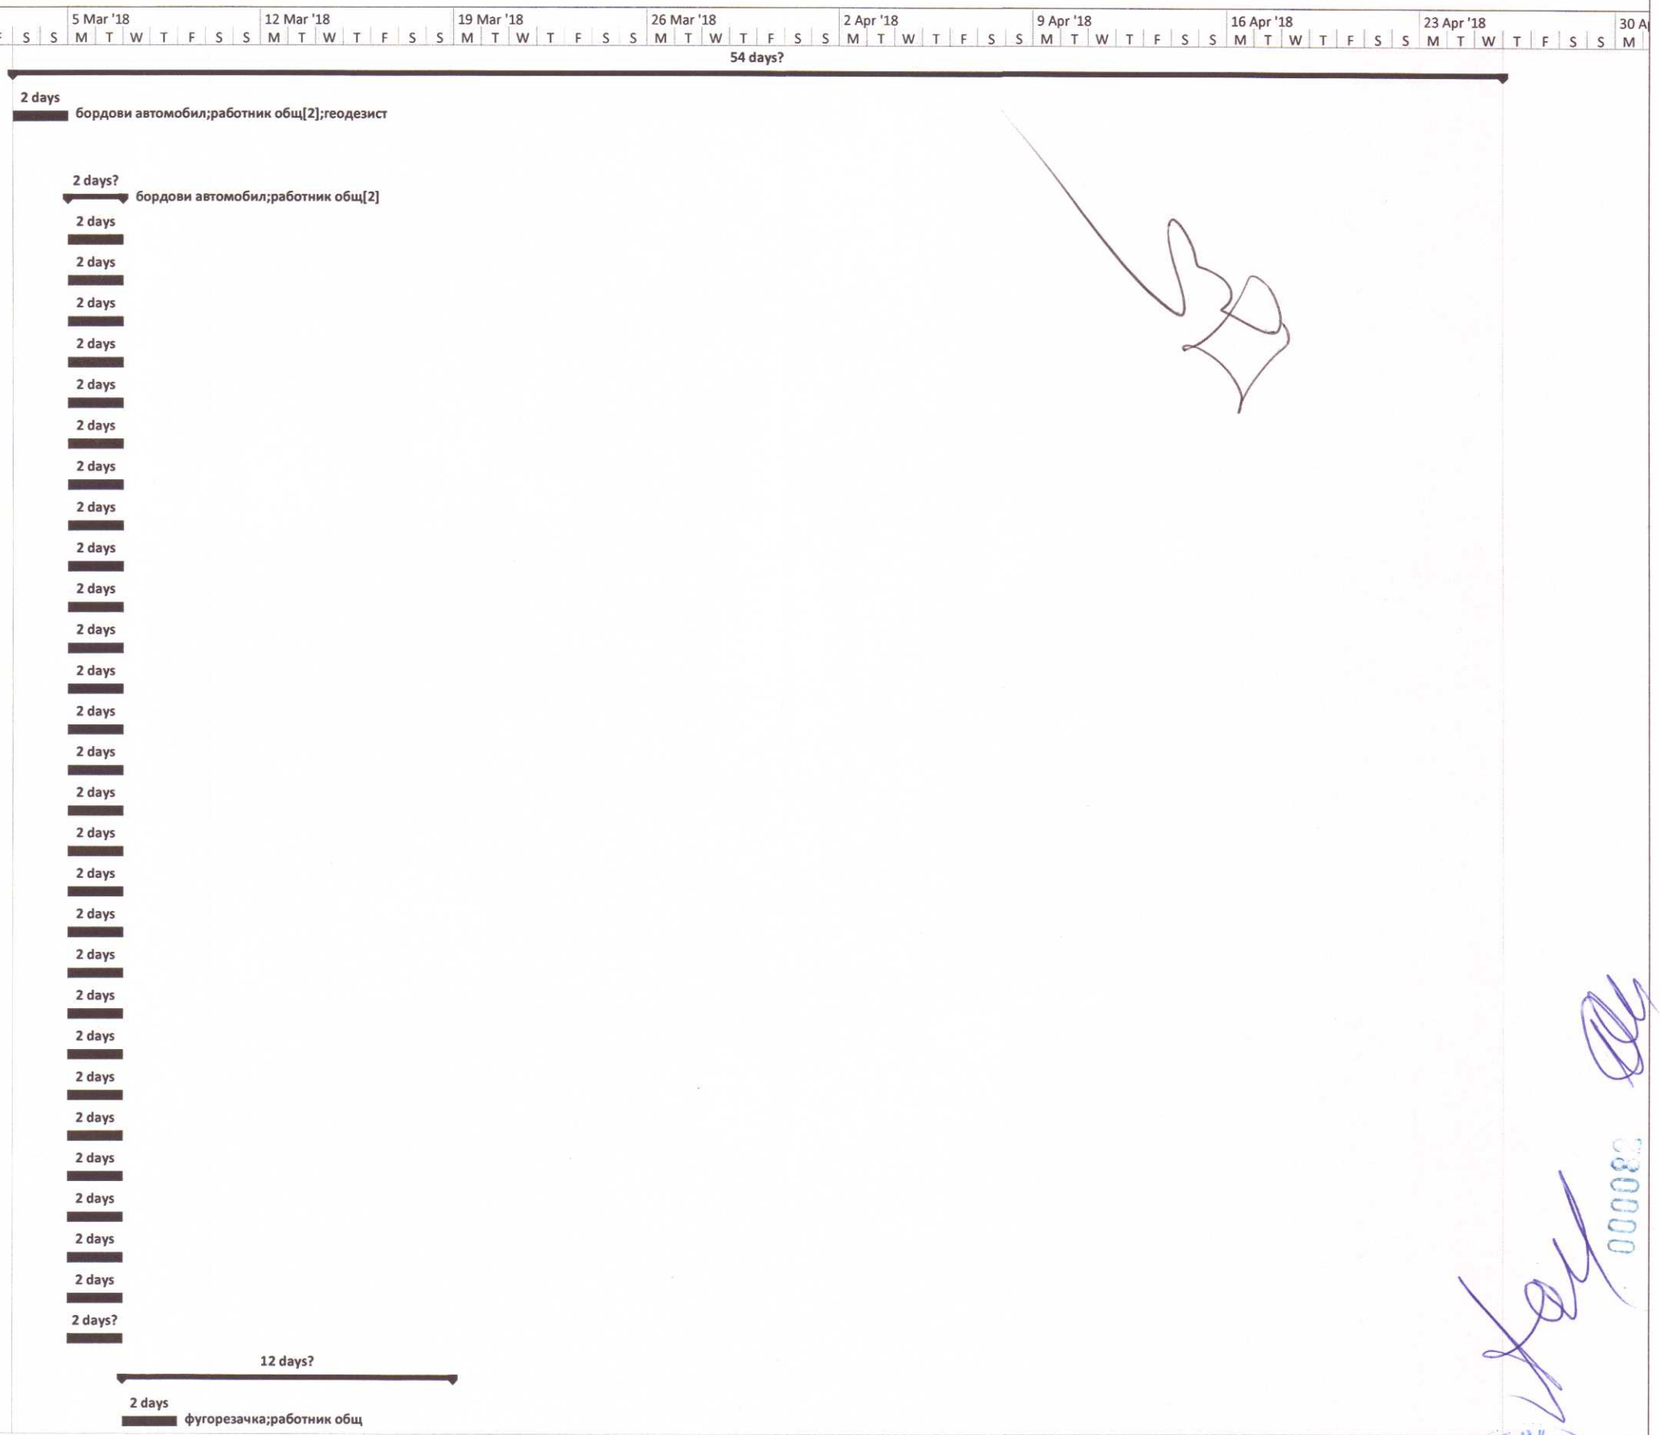

Project: NOV grafik_vik_stambolo
Date: Fri 19.1.18

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | Deadline | Progress | Manual Progress

Управител:.....
