
ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Виктор Юго"

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
1		**ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ОБЕКТА**	**54 days**	**Sat 03/03/18**	**Wed 25/04/18**	
2		**Подготвителни работи,разполагане на техника и фургони, Устройване на складови площи, ВОБДП, Геодезическо отлагане на**	2 days	Sat 03/03/18	Sun 04/03/18	бордови автомобил,работник общ[2],геодезист
3		**Доставка на материали**	**2 days**	**Mon 05/03/18**	**Tue 06/03/18**	**бордови автомобил,работник общ[2]**
4		ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
5		ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
6		ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
7		ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN160/110 - 1MPa	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
8		Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф110/90 - 10А	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
9		Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
10		ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/10А 90ГР.	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
11		ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PEHD DN160 (30 градуса) - 1MPa	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
12		ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PEHD DN160 (45 градуса) - 1MPa	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
13		ДОСТАВКА КАПА PEHD DN90 - 1MPa	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
14		Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
15		Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК PEHD DN160 - 1MPa	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
16		ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
17		СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
18		СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN150 - 1MPa	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
19		ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
20		СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА DN150	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
21		ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	2 days	Mon 05/03/18	Tue 06/03/18	
22		**Участък 1 - В1 - В6 - стр.дейности по трасе на водопровод - етап 1**	**12 days**	**Wed 07/03/18**	**Sun 18/03/18**	
23		Рязане на асфалтова настилка - Механизирано двустранно	2 days	Wed 07/03/18	Thu 08/03/18	фугорезачка,работник общ
24		РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	2 days	Thu 08/03/18	Fri 09/03/18	багер с хидрочук
25		НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКАТА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	1 day	Sat 10/03/18	Sat 10/03/18	багер комбиниран
26		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ ИЗВЪН НАС.МЕСТО	1 day	Sat 10/03/18	Sat 10/03/18	самосвал[2]
27		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СТР.ОТПАДЪЦИ С ПРОБЕГ 41-100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	1 day	Sat 10/03/18	Sat 10/03/18	булдозер
28		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	3 days	Sun 11/03/18	Tue 13/03/18	багер комбиниран
29		ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	3 days	Mon 12/03/18	Wed 14/03/18	изкопчия[4]
30		ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	2 days	Wed 14/03/18	Thu 15/03/18	къртач пневматичен,компресор,раб общ[2]
31		НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	2 days	Wed 14/03/18	Thu 15/03/18	багер комбиниран

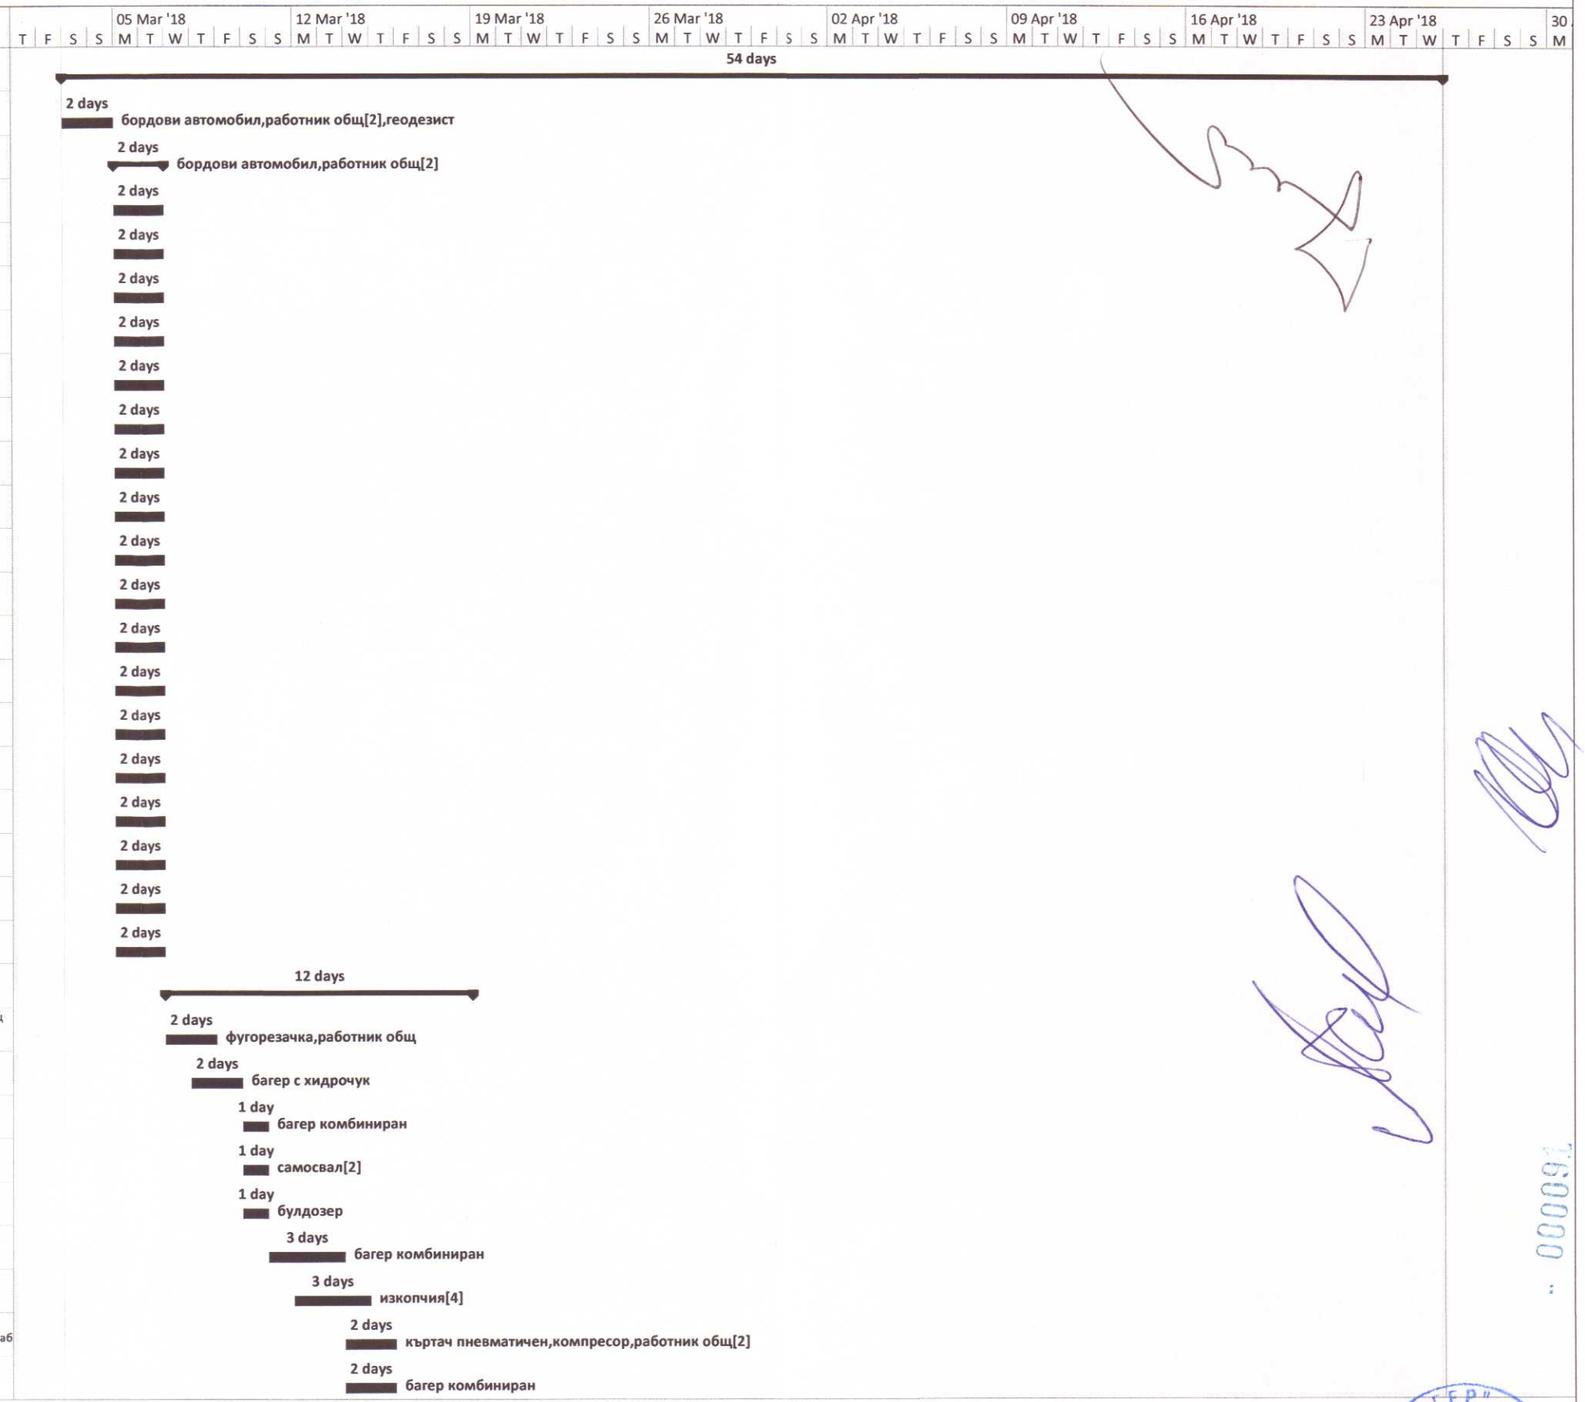

Project: grafik_vik_UGO	Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Manual Progress
	Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline	
	Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress	

Управител.....
