
ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Виктор Юго"

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
63		Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	5 days	Mon 19/03/18	Fri 23/03/18	ВиК монтажник
64		ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	5 days	Mon 19/03/18	Fri 23/03/18	ВиК монтажник
65		Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	5 days	Mon 19/03/18	Fri 23/03/18	ВиК монтажник
66		**Участък 1 - В1 - В6 - стр.дейности по трасе на водопровод - етап 2**	**4 days**	**Sat 24/03/18**	**Tue 27/03/18**	
67		Полагане на метална нишка,залепена на теме тръба	1 day	Sat 24/03/18	Sat 24/03/18	работник общ
68		ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	1 day	Sat 24/03/18	Sat 24/03/18	самосвал[2]
69		НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /30 см.над теме тръба/	1 day	Sat 24/03/18	Sat 24/03/18	работник общ[2],багер комбиниран,ръчна трамбовка
70		НЕПЛЪТНО РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	1 day	Sat 24/03/18	Sat 24/03/18	работник общ
71		ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	1 day	Sat 24/03/18	Sat 24/03/18	ВиК монтажник,работник общ,компресор
72		ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426	1 day	Sat 24/03/18	Sat 24/03/18	*същите като горната позиция
73		ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	1 day	Sun 25/03/18	Sun 25/03/18	самосвал[2]
74		МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	1 day	Sun 25/03/18	Sun 25/03/18	багер комбиниран,работник общ[2]
75		УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	1 day	Sun 25/03/18	Sun 25/03/18	работник общ,механична трамбовка
76		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА /50 см.над теме тръба	1 day	Sun 25/03/18	Sun 25/03/18	работник общ
77		ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	2 days	Mon 26/03/18	Tue 27/03/18	работник общ
78		ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ	2 days	Mon 26/03/18	Tue 27/03/18	работник общ
79		**Участък 1 - В1 - В6 - стр.дейности по СВО - етап 2**	**1 day**	**Sun 25/03/18**	**Sun 25/03/18**	
80		ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	1 day	Sun 25/03/18	Sun 25/03/18	*самосвал /вкл. в СМР по трасе
81		МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	1 day	Sun 25/03/18	Sun 25/03/18	*багер комбиниран и 2 работник общ /вкл. в СМР по трасе
82		УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	1 day	Sun 25/03/18	Sun 25/03/18	*работник общ;мех.трамбовка/вкл. в СМР по трасе
83		ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	1 day	Sun 25/03/18	Sun 25/03/18	работник общ
84		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	1 day	Sun 25/03/18	Sun 25/03/18	булдозер
85		**Участък 2 - В6 - В10 - стр.дейности по трасе на водопровод - етап 1**	**8 days**	**Wed 28/03/18**	**Wed 04/04/18**	
86		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	3 days	Wed 28/03/18	Fri 30/03/18	багер комбиниран
87		ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	3 days	Thu 29/03/18	Sat 31/03/18	изкопчия[4]
88		ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	2 days	Sat 31/03/18	Sun 01/04/18	къртач пневматичен,компресор,работник общ[2]
89		НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	2 days	Sat 31/03/18	Sun 01/04/18	багер комбиниран
90		НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	1 day	Mon 02/04/18	Mon 02/04/18	работник общ[4]
91		ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	6 days	Wed 28/03/18	Mon 02/04/18	самосвал[2]
92		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	6 days	Wed 28/03/18	Mon 02/04/18	булдозер
93		НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	6 days	Wed 28/03/18	Mon 02/04/18	работник общ[2]

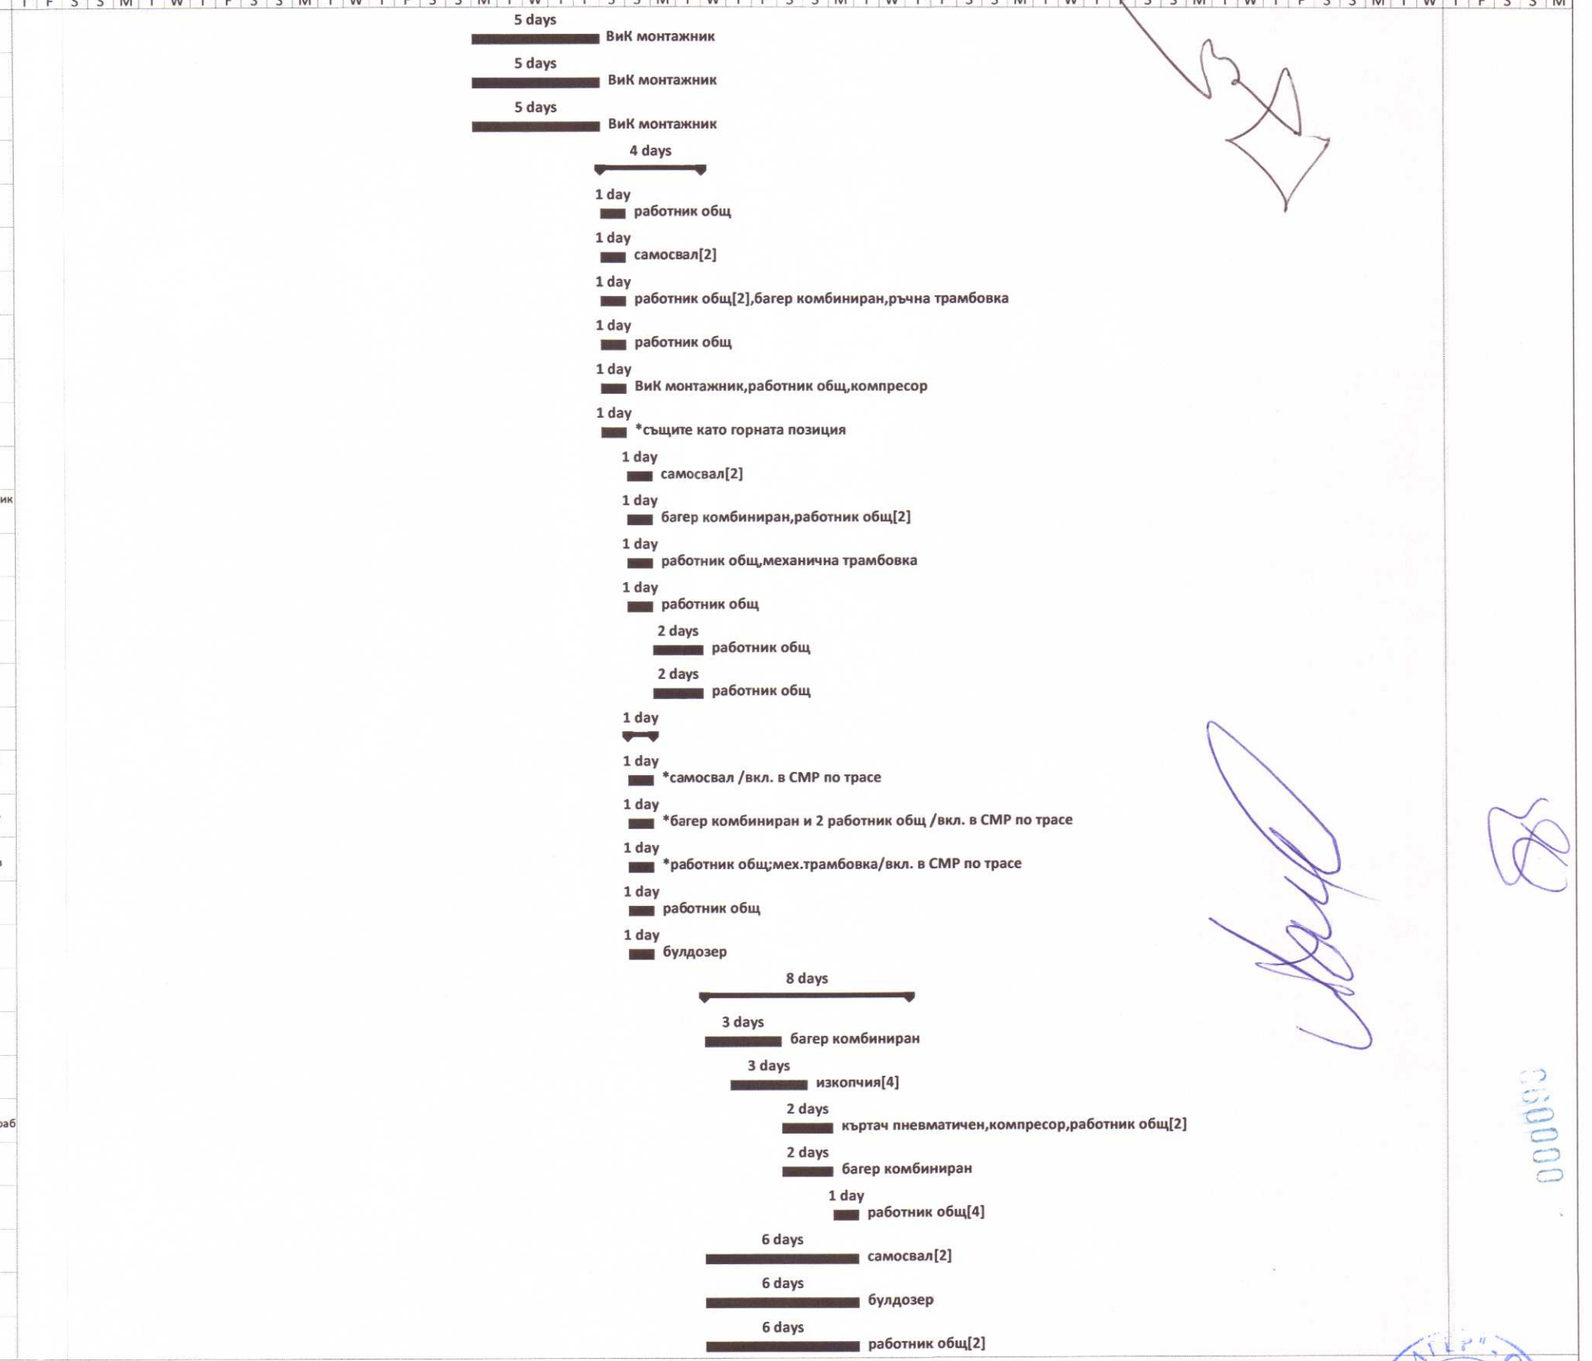

Project: grafik_vik_UGO

Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline	
Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress	

Управител.....
