
ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обособена позиция № 13 с предмет „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок „Златолист” в гр. Златоград”

ID	Име	мярка	дни	начало	край
1	**ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПРОЕКТА**		**110 days**	**Sat 01/04/17**	**Wed 19/07/17**
2	**Подготвителни работи,разполагане на техника и фургони, Устройване на складови площи.**		6 days	Sat 01/04/17	Thu 06/04/17
3	**ЧАСТ АРХИТЕКТУРА**		**95 days**	**Fri 07/04/17**	**Mon 10/07/17**
4	**ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДЪРВЕНА И ЖЕЛЯЗНА ДОГРАМА**	**м2**	**53 days**	**Fri 14/04/17**	**Mon 05/06/17**
5	ЕТАП 1		8 days	Fri 14/04/17	Fri 21/04/17
6	ЕТАП 2		8 days	Mon 29/05/17	Mon 05/06/17
7	**ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С 10 СМ. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ**	**м2**	**65 days**	**Sat 22/04/17**	**Sun 25/06/17**
8	ЕТАП 1		20 days	Sat 22/04/17	Thu 11/05/17
9	ЕТАП 2		20 days	Tue 06/06/17	Sun 25/06/17
10	**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИСТЕМА СТУКТУРНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ**	**м2**	**55 days**	**Fri 12/05/17**	**Wed 05/07/17**
11	ЕТАП 1		10 days	Fri 12/05/17	Sun 21/05/17
12	ЕТАП 2		10 days	Mon 26/06/17	Wed 05/07/17
13	**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ЗА ЦОКЪЛ**	м2	5 days	Thu 06/07/17	Mon 10/07/17
14	**ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ**	**м2**	**52 days**	**Fri 07/04/17**	**Sun 28/05/17**
15	ЕТАП 1		7 days	Fri 07/04/17	Thu 13/04/17
16	ЕТАП 2		7 days	Mon 22/05/17	Sun 28/05/17
17	**ШПАКЛОВАНЕ, БОЯДИСВАНЕ И РЕМОНТ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА БЛОКА**	м2	20 days	Mon 22/05/17	Sat 10/06/17
18	**ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА**		10 days	Fri 14/04/17	Sun 23/04/17
19	**ДЕМОНТАЖ И ПОЛАГАНЕ НА НОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ**		22 days	Fri 14/04/17	Fri 05/05/17
20	**ДЕМОНТАЖ И ПОЛАГАНЕ НА НОВ БОРД ОТ ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ**		8 days	Sat 06/05/17	Sat 13/05/17
21	**ЧАСТ ЕЛЕКТРО**		**58 days**	**Fri 14/04/17**	**Sat 10/06/17**
22	**ПОДМЯНА НА ГРЪМООТВОДНАТА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ**	бр	20 days	Fri 14/04/17	Wed 03/05/17
23	**Подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енерго спестяващо**	бр	20 days	Mon 22/05/17	Sat 10/06/17
24	**ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ**		5 days	Tue 11/07/17	Sat 15/07/17
25	**ВРЕМЕ ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ**		4 days	Sun 16/07/17	Wed 19/07/17

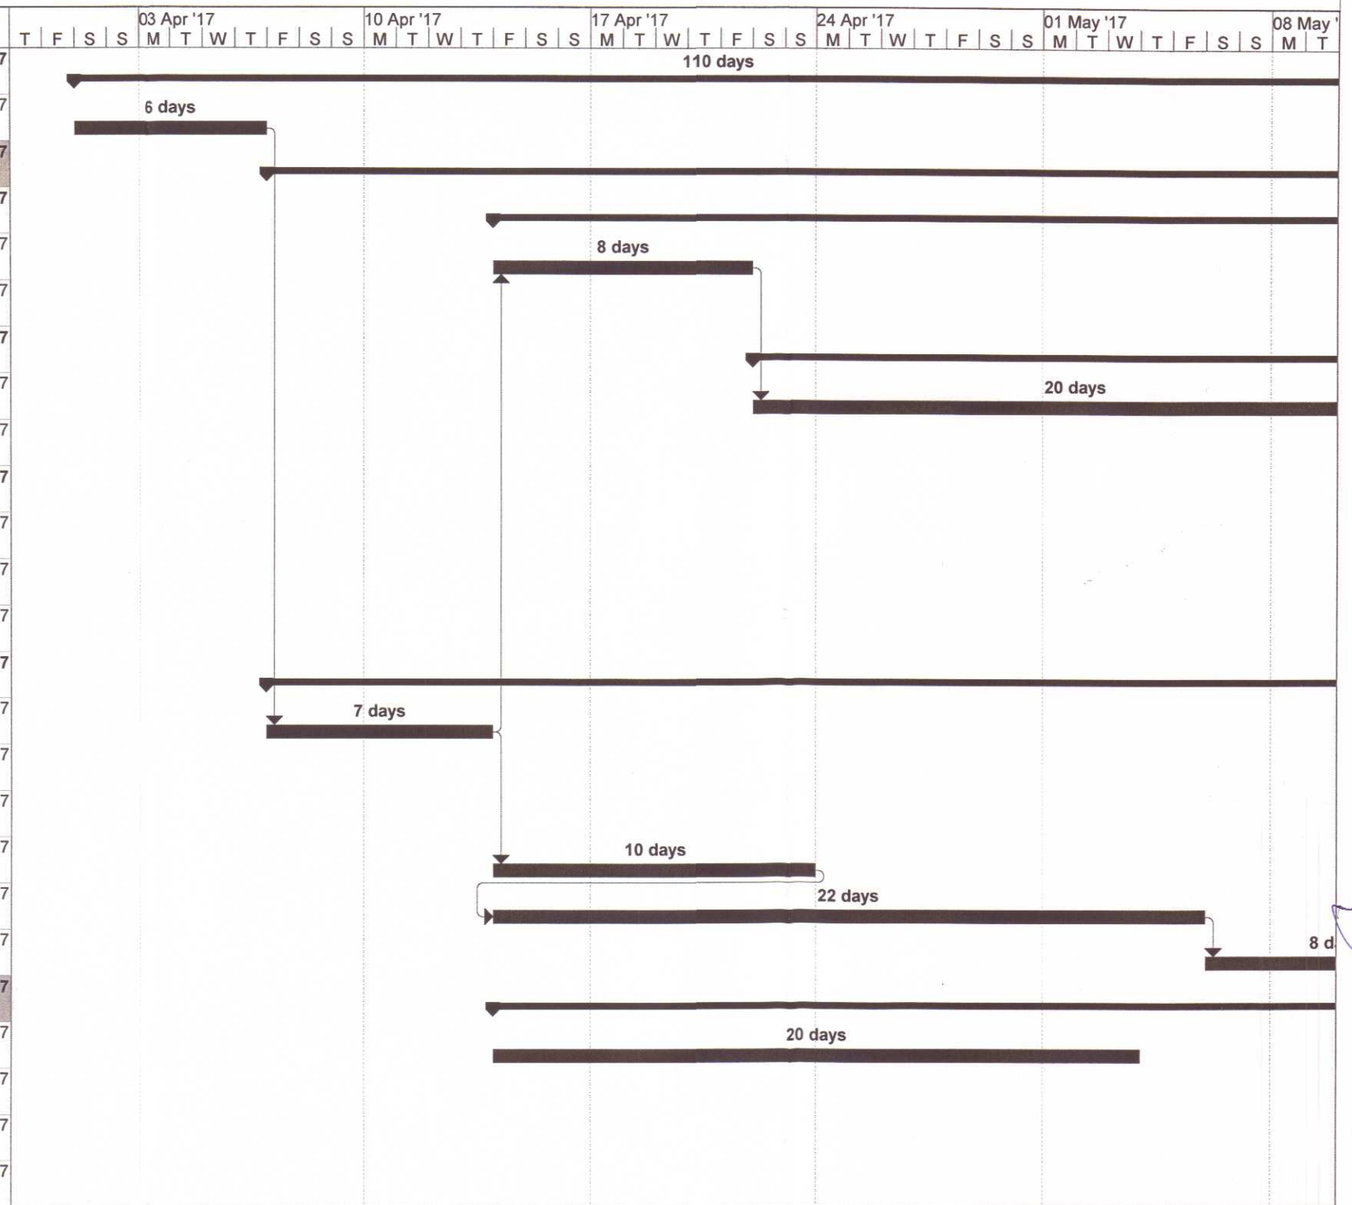

000103

Project: grafik_zlatograd_EE_2

Task	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone
Split	External Tasks	Manual Task	Start-only	Progress
Milestone	External Milestone	Duration-only	Finish-only	Deadline
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	
